


COMUNE DI BARLETTA

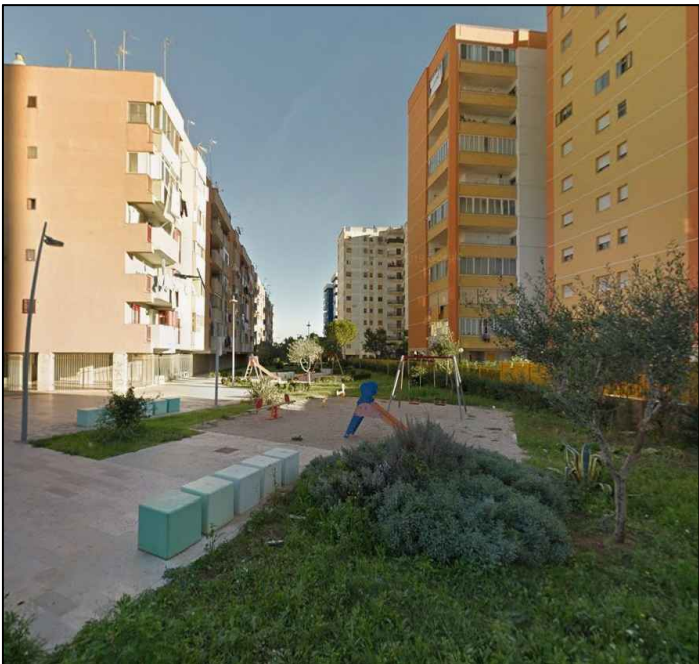

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, DEI CORPI ILLUMINANTI, DEGLI ARREDI URBANI SITI NEL COMUNE DI BARLETTA IN VIA CAPOSSELE, VIA FILOGRASSI E VIA UNGARETTI

PROGETTO ESECUTIVO

titolo documento			disciplina		
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI			Multidisciplinare		
			codice		
			PE.DT.02		
rev.	data	descrizione	verif.	approv.	scala
0	Luglio 2026	prima emissione	v	v	
					formato
					A3
PROGETTAZIONE			APPALTATORE		
Tecnico					
Ing. Vincenza Mansi					
			COMMITTENTE		
			Comune di Barletta		
			Via Cavour 1, 76121, Barletta (BT)		
			Settore Lavori Pubblici		
			dirigente.lpp@comune.barletta.bt.it		
			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		
			Ing. Giuseppe Dipace		

COMUNE DI BARLETTA – PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, DEI CORPI ILLUMINANTI E DEGLI ARREDI URBANI IN VIA CAPOSSELE, VIA FILOGRASSI E VIA UNGARETTI																	
PROGETTO ESECUTIVO – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – Elaborato PE.DT.02 – Rev. 1 (Luglio 2026) – aggiornamento su base CME: "Illuminazione", "Marciapiede", "Giostre"																	
Durata complessiva: 9 settimane – 61 giorni naturali e consecutivi (≈ 45 gg lavorativi) • Consegna lavori: lunedì 5/10/2026 • Ultimazione: venerdì 4/12/2026 • Importo lavori (somma CME, esclusi oneri sicurezza): € 116.240,61																	

QUADRO DELLE LAVORAZIONI									MESE 1 – OTTOBRE 2026				MESE 2 – NOVEMBRE 2026				DIC. 2026
N°	WBS	Descrizione lavorazione	Rif. voci CME	Importo lavori (€)	Durata (gg lav.)	Sett. inizio	Sett. fine	Predecessore	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
									5-9/10	12-16/10	19-23/10	26-30/10	2-6/11	9-13/11	16-20/11	23-27/11	30/11-4/12
A – ALLESTIMENTO CANTIERE (attività comuni – oneri in spese generali)					S1 / S5												
1	A.1	Allestimento cantiere Lavoro 1 – Via Capossele ang. Via Gesualdo (recinzioni, accessi, baraccamenti e servizi)	—		5	1	1	—									
2	A.2	Impianto elettrico di cantiere e apprestamenti	—		3	1	1	A.1 (II)									
3	A.3	Segnaletica stradale di cantiere e delimitazione delle lavorazioni	—		2	1	1	A.1 (II)									
4	A.4	Allestimento cantiere Lavoro 2 – Viale Giulini ang. Via Filograssi	—		2	5	5	—									
5	A.5	Allestimento cantiere Lavoro 3 – Via Ungaretti	—		2	5	5	—									
B – LAVORO 1 – MANUTENZ. STRAORD. INFRASTRUTTURE VIARIE, MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE – Via Capossele ang. Via Gesualdo [CME "Marciapiede"]				69 020,33	S1 → S9 (5/10 – 4/12)												
6	B.1	Rimozione cigli in travertino e disfacimento pavimentazione in masselli, con recupero	L1: 1-2	682,75	4	1	2	A.3	341	341							
7	B.2	Demolizione strutture in c.a. e sottofondi stabilizzati	L1: 3-4	344,96	3	2	2	B.1 (II)		345							
8	B.3	Scavo di sbancamento carreggiata e marciapiedi (211,75 m³)	L1: 5	1 827,40	8	2	3	B.2 (II)		914	914						
9	B.4	Trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta	L1: 6-7	12 140,39	12	2	4	B.1 (II)		4 047	4 047	4 047					
10	B.5	Scavi a sezione obbligata per cavidotti illuminazione (80 m) e plinti pali	L1: 27, 30	2 310,68	6	3	4	B.3 (II)			1 155	1 155					
11	B.6	Letto di sabbia, posa cavidotto Ø125 mm e nastro di segnalazione	L1: 28-29, 31	1 400,32	4	4	4	B.5 (II)				1 400					
12	B.7	Blocchi di fondazione pali, pozzetti di ispezione 30×30 e dispersori di terra	L1: 35, 39-40	1 616,82	6	4	5	B.6 (II)				808	808				
13	B.8	Rinterri tratta impianti, trasporto e conferimento a discarica	L1: 32-34	2 110,21	3	5	5	B.7 (II)					2 110				
14	B.9	Sottofondazione carreggiata in misto cementato al 6% (73,50 m³)	L1: 9	5 671,26	4	5	5	B.3; B.8 (II)					5 671				
15	B.10	Sottofondazione marciapiedi in misto granulare (53,55 m³)	L1: 8	1 803,56	5	5	6	B.9 (II)					902	902			
16	B.11	Massetto e posa cordoni in pietra calcarea bocciardata di Cisternino (102,45 m)	L1: 19-20	5 058,59	8	6	7	B.10 (II)						2 529	2 529		
17	B.12	Soletta marciapiedi in cls C16/20 con rete elettrosaldata B450C	L1: 10-11	4 356,79	6	6	7	B.11 (II)						2 178	2 178		
18	B.13	Pavimentazione marciapiedi in masselli e percorsi tattili LOGES (155 m² ca.)	L1: 12-13	7 835,68	8	7	8	B.12 (II)							3 918	3 918	
19	B.14	Strato di base/binder carreggiata, spess. compattato 8 cm (245 m²)	L1: 14-15	6 316,10	3	7	7	B.9; B.11 (II)							6 316		
20	B.15	Posa pali illuminazione h 7,80 m, sbracci e staffe (previa maturazione plinti)	L1: 43-44	3 140,28	3	7	7	B.7							3 140		
21	B.16	Cablaggi BT e di terra, muffole, apparecchi LED CAM 29W+43W, morsettiere	L1: 36, 38, 41-42, 45-47	5 295,08	5	8	8	B.15								5 295	
22	B.17	Mano d'attacco e tappetino di usura carreggiata, spess. 4 cm (245 m²)	L1: 16-18	4 647,65	3	8	8	B.14; B.15								4 648	
23	B.18	Rivestimento protettivo colorato su percorso pedonale (40 m²)	L1: 37	1 651,60	3	8	9	B.17								826	826
24	B.19	Segnaletica verticale (segnali, paletti e montaggio)	L1: 21-24	609,71	3	8	9	B.17 (II)								305	305
25	B.20	Segnaletica orizzontale (attraversamenti in termocolato e stalli)	L1: 25-26	200,50	2	9	9	B.17; B.19 (II)									201
26	B.21	Allacciamento e prove funzionali impianto di illuminazione	onere compreso nelle voci impianto		2	9	9	B.16									
C – LAVORO 2 – MANUTENZ. STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE (3 corpi illuminanti) – Viale Giulini ang. Via Filograssi [CME "Illuminazione"]				19 513,47	S5 → S9 (2/11 – 4/12)												
27	C.1	Disfacimento pavimentazione in masselli con recupero (70%), demolizione cls e sottofondo	L2: 1-3	834,38	3	5	5	A.4					834				
28	C.2	Scavo a sezione obbligata per cavidotti (80 m) e plinti pali	L2: 8, 11	2 310,68	5	5	6	C.1 (II)					1 155	1 155			
29	C.3	Letto di sabbia, posa cavidotto Ø125 mm e nastro di segnalazione	L2: 9-10, 12	1 400,32	3	6	6	C.2 (II)						1 400			

QUADRO DELLE LAVORAZIONI									MESE 1 – OTTOBRE 2026				MESE 2 – NOVEMBRE 2026				DIC. 2026
N°	WBS	Descrizione lavorazione	Rif. voci CME	Importo lavori (€)	Durata (gg lav.)	Sett. inizio	Sett. fine	Predecessore	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
									5–9/10	12–16/10	19–23/10	26–30/10	2–6/11	9–13/11	16–20/11	23–27/11	30/11–4/12
30	C.4	Blocchi di fondazione pali, pozzetti di ispezione 30×30 e dispersori di terra	L2: 16, 20–21	1 616,82	4	6	6	C.3 (II)						1 617			
31	C.5	Rinterri, trasporto e conferimento a discarica	L2: 13–15	2 110,21	4	6	7	C.4 (II)						1 055	1 055		
32	C.6	Ripristini: sottofondazione, soletta cls con rete e pavimentazione in masselli	L2: 4–7	1 154,10	4	7	7	C.5							1 154		
33	C.7	Posa pali illuminazione h 7,80 m, sbracci e staffe (previa maturazione plinti)	L2: 24–25	3 140,28	4	7	8	C.4							1 570	1 570	
34	C.8	Cablaggi BT (FG16OR16 3×16 e 2×2,5), corda di terra e muffole di derivazione	L2: 17, 19, 22–23	2 186,57	3	8	8	C.7 (II)								2 187	
35	C.9	Apparecchi LED CAM 29W (q. 3,50 m) e 43W (q. 8,00 m), morsettiere	L2: 26–28	3 108,51	2	8	8	C.8 (II)								3 109	
36	C.10	Rivestimento protettivo colorato (40 m²)	L2: 18	1 651,60	3	8	9	C.6								826	826
37	C.11	Allacciamenti elettrici e prove funzionali impianto	onere compreso nelle voci impianto		2	9	9	C.9									
D – LAVORO 3 – RIPRISTINO GIOSTRE E ARREDO URBANO – Via Ungaretti [CME "Giostre"]				27 706,81	S5 → S9 (2/11 – 4/12)												
38	D.1	Scavo di sbancamento area giochi/antitrauma (49,00 m³)	L3: 1	422,87	3	5	5	A.5					423				
39	D.2	Trasporto e conferimento a discarica autorizzata	L3: 2–3	2 646,49	4	5	6	D.1 (II)					1 323	1 323			
40	D.3	Sottofondazione in misto granulare (29,40 m³)	L3: 4	990,19	3	6	6	D.1						990			
41	D.4	Massetto e cordoli perimetrali in c.a.v. (56 m)	L3: 8–9	1 242,91	5	6	7	D.3 (II)						621	621		
42	D.5	Soletta in cls C16/20 con rete elettrosaldata B450C	L3: 5–6	2 391,95	3	7	7	D.4 (II)							2 392		
43	D.6	Pavimentazione antitrauma in caucciù sp. 45 mm, HIC 150 cm (98 m²) – previa maturazione soletta	L3: 7	8 620,08	5	8	8	D.5								8 620	
44	D.7	Montaggio attrezzature ludiche UNI EN 1176: scivoli, altalene, bilici, giochi a molla	L3: 12–15	11 014,10	7	8	9	D.6 (II)								5 507	5 507
45	D.8	Posa cestini portarifiuti con pali di sostegno	L3: 10–11	378,22	1	9	9	D.7 (II)									378
E – CHIUSURA CANTIERE (attività comuni – oneri in spese generali)									S9								
46	E.1	Pulizia finale delle aree di intervento (tre siti)	—		2	9	9	B.21; C.11; D.8									
47	E.2	Verifiche finali, prove tecniche e collaudi	—		2	9	9	E.1 (II)									
48	E.3	Smobilizzo cantieri	—		2	9	9	E.2 (II)									

LEGENDA – ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO E CORRISPONDENZA CON I COMPUTI METRICI	
A – Allestimento cantiere (attività comuni ai tre lavori) – oneri compresi nelle spese generali	
B – LAVORO 1: infrastrutture viarie, marciapiedi e illuminazione – Via Capossele ang. Via Gesualdo – rif. CME "Marciapiede"	69 020,33
C – LAVORO 2: pubblica illuminazione (3 pali, 6 apparecchi LED) – Viale Giulini ang. Via Filograssi – rif. CME "Illuminazione"	19 513,47
D – LAVORO 3: ripristino giostre e arredo urbano – Via Ungaretti – rif. CME "Giostre"	27 706,81
E – Chiusura cantiere (attività comuni ai tre lavori) – oneri compresi nelle spese generali	
TOTALE LAVORI	116 240,61
