COMUNE DI **BARLETTA**

PROVINCIA DI Barletta-Andria-Trani

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di riqualificazione del velodromo ubicato presso la struttura sportiva "Stadio Comunale Lello Simeone"

CUP: H92H25000160001

Data: Marzo 2026

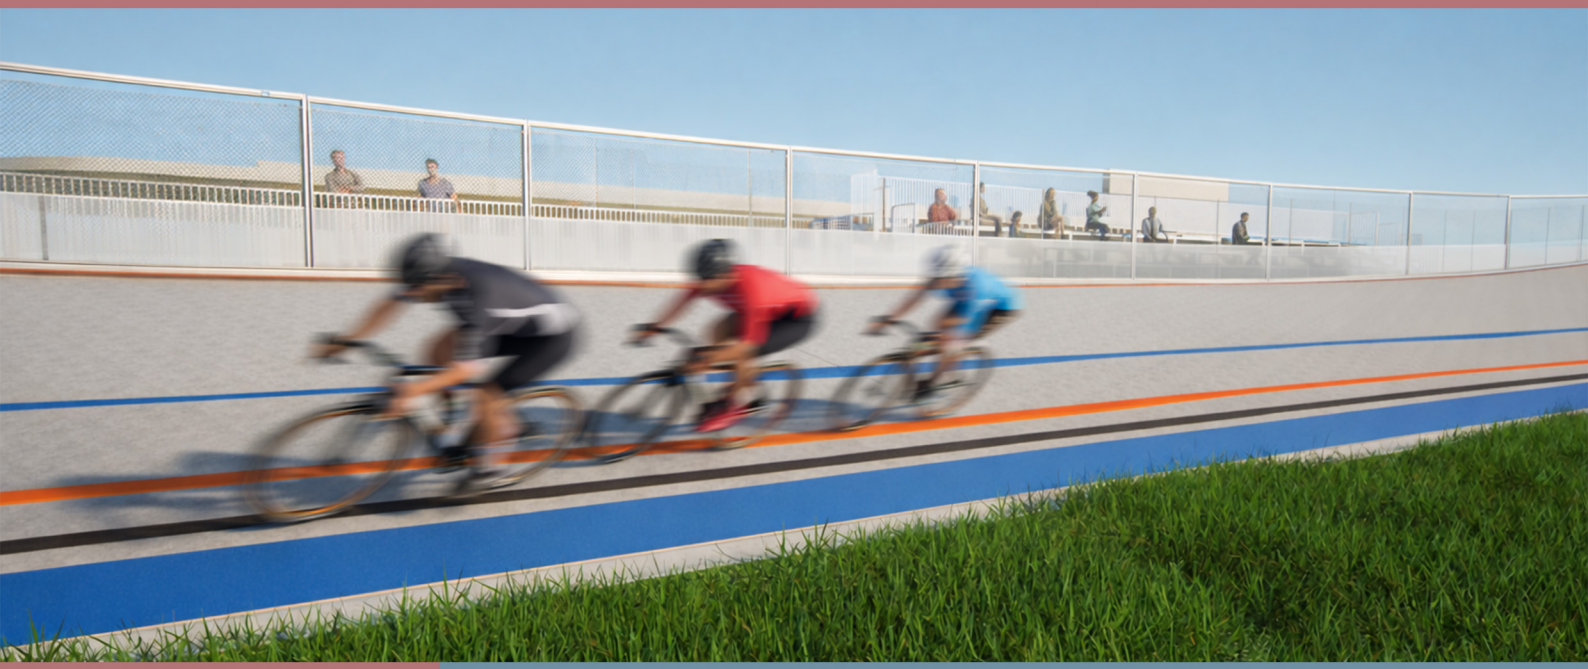

SICU.02

Cronoprogramma dei Lavori

REV. 1

RUP

Geom. Ruggiero Leone

PROGETTISTI

Ing. Antonio Gatto

Ing. Iolanda Aita

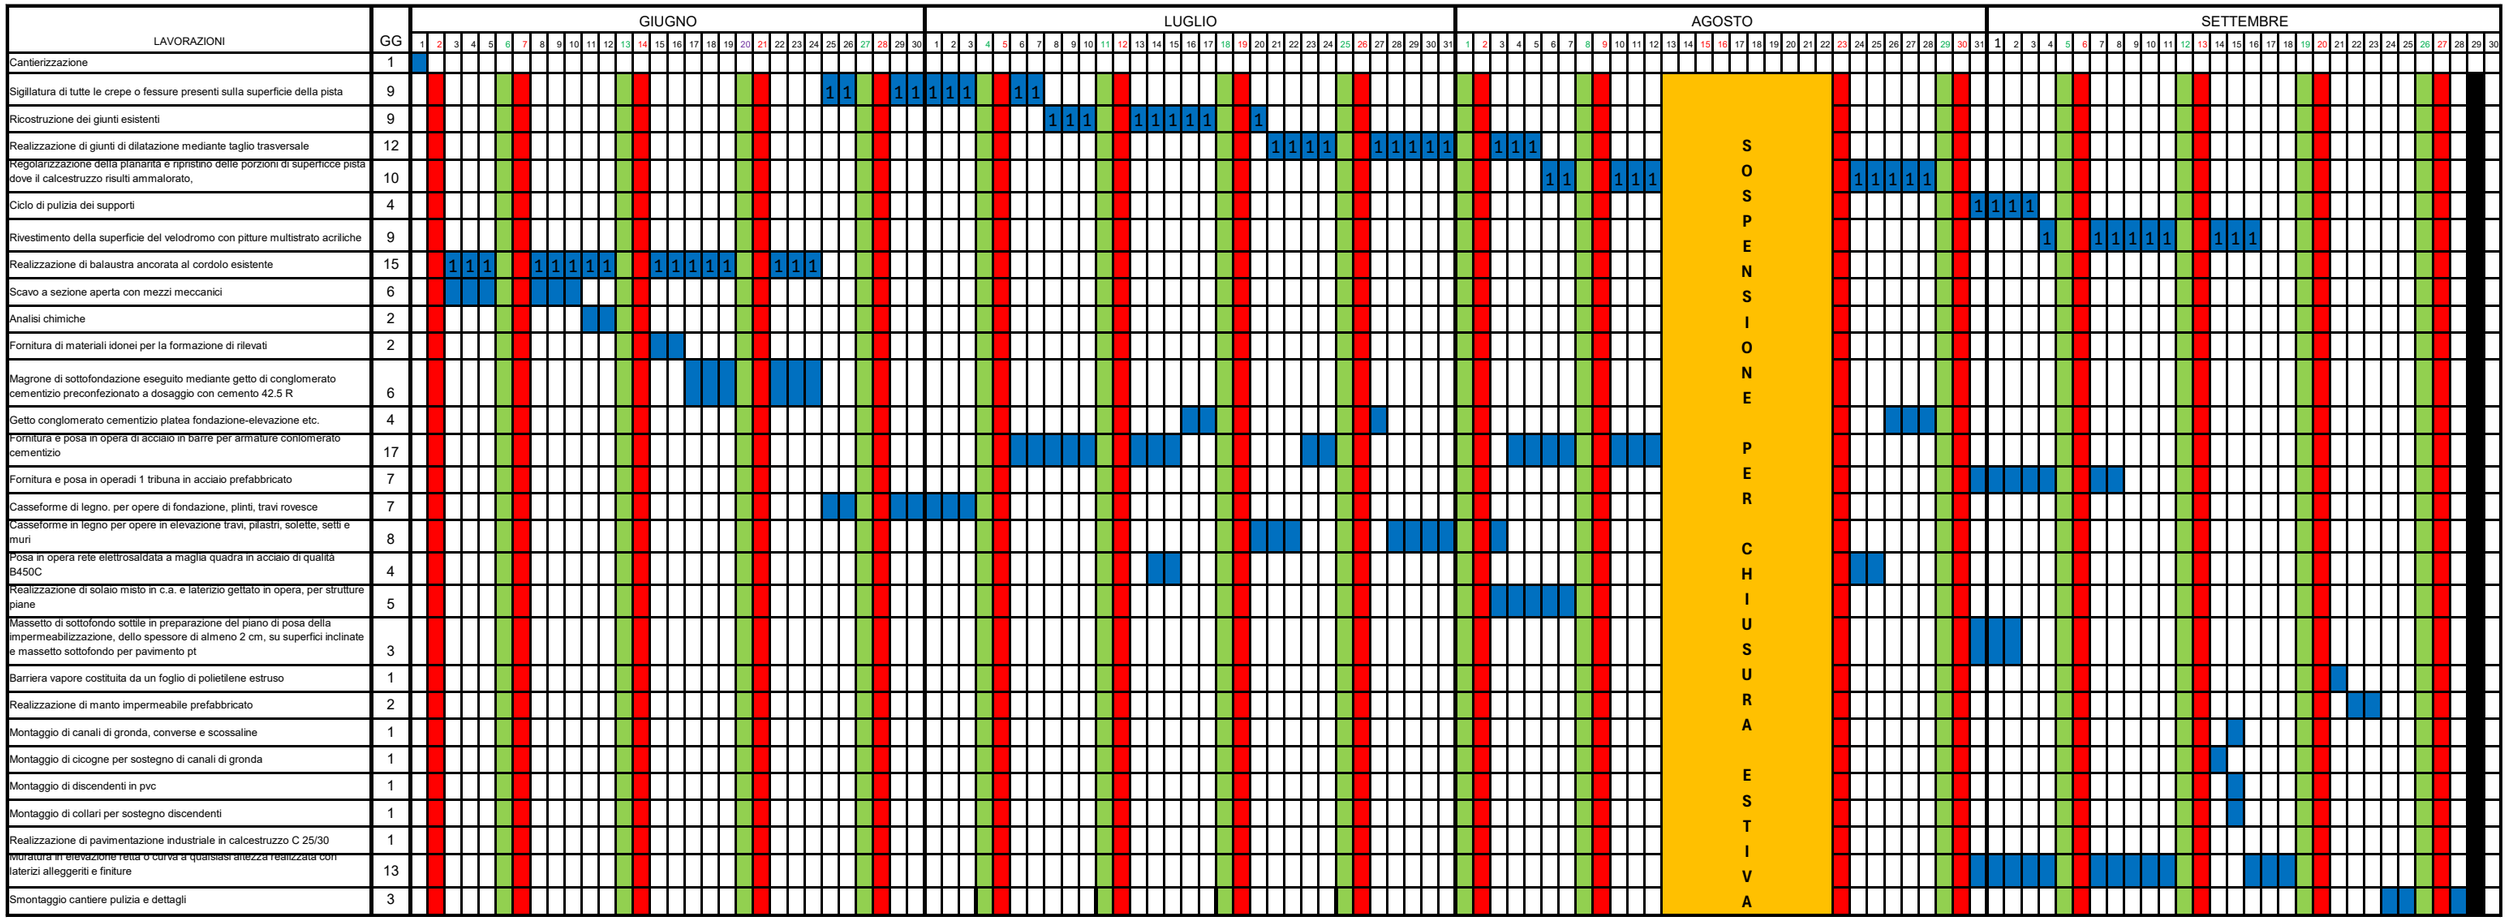
LAVORAZIONI
GG
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
Cantierizzazione 1
Sigillatura di tutte le crepe o fessure presenti sulla superficie della pista 9
Ricostruzione dei giunti esistenti 9
Realizzazione di giunti di dilatazione mediante taglio trasversale 12
Regolarizzazione della planarità e ripristino delle porzioni di superficie pista dove il calcestruzzo risulti ammalorato. 10
Ciclo di pulizia dei supporti 4
Rivestimento della superficie del velodromo con pitture multistrato acriliche 9
Realizzazione di balaustra ancorata al cordolo esistente 15
Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici 6
Analisi chimiche 2
Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati 2
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R 6
Getto conglomerato cementizio platea fondazione-elevazione etc. 4
Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature conlomerato cementizio 17
Fornitura e posa in operadi 1 tribuna in acciaio prefabbricato 7
Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce 7
Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri 8
Posa in opera rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C 4
Realizzazione di solaio misto in c.a. e laterizio gettato in opera, per strutture piane 5
Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, su superfici inclinate e massetto sottofondo per pavimento pt 3
Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso 1
Realizzazione di manto impermeabile prefabbricato 2
Montaggio di canali di gronda, converse e scossaline 1
Montaggio di cicogne per sostegno di canali di gronda 1
Montaggio di discendenti in pvc 1
Montaggio di collari per sostegno discendenti 1
Realizzazione di pavimentazione industriale in calcestruzzo C 25/30 1
Muratura in elevazione retta o curva a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti e finiture 13
Smontaggio cantiere pulizia e dettagli 3
SOSPENSIONE PER CHIUSURA ESTIVA
