Comune di Barletta
Provincia di BT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: "Lavori di recupero e ristrutturazione della Palazzina di Via Galvani da destinare a "Centro Servizi per l'Internazionalizzazione" - PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI BARLETTA - SETTORE MANUTENZIONI

CANTIERE: Viale Marconi angolo Via Galvani, Barletta (BT)

Barletta, 22/12/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA - TECNICO OPERE E IMPIANTI DEL SETTORE MANUTENZIONI - COMUNE DI BARLETTA LEONE RUGGIERO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(DIRIGENTE DI BARI GIANRODOLFO)

GEOMETRA - TECNICO OPERE E IMPIANTI DEL SETTORE MANUTENZIONI - COMUNE DI BARLETTA LEONE RUGGIERO
VIALE MARCONI 31
76121 BARLETA (BT)
Tel.: $EMPTY_CSP_09$ - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: $EMPTY_CSP_11$

Cer'Fus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	5	5	23/03/2015	27/03/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	1	1	30/03/2015	30/03/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	31/03/2015	01/04/2015
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	02/04/2015	03/04/2015
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	07/04/2015	07/04/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	30/03/2015	30/03/2015
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	E	1	1	01/04/2015	01/04/2015
Rimozione di impianti	1	E	2	2	08/04/2015	09/04/2015
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	8	10	08/04/2015	17/04/2015
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	2	2	13/04/2015	14/04/2015
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	1	1	14/04/2015	14/04/2015
Demolizione di tetti a falde con orditura in legno	1	E	3	3	20/04/2015	22/04/2015
Rimozione di serramenti interni	1	E	1	1	23/04/2015	23/04/2015
Rimozione di pavimenti interni	1	E	2	4	24/04/2015	27/04/2015
Rimozione di massetto	1	E	3	3	28/04/2015	30/04/2015
Demolizione di pareti divisorie	1	E	5	5	04/05/2015	08/05/2015
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	2	2	11/05/2015	12/05/2015
Demolizione di solai in legno	1	E	3	3	13/05/2015	15/05/2015
Demolizione di solai in c.a.	1	E	3	3	18/05/2015	20/05/2015
Taglio di muratura a tutto spessore	1	E	2	2	21/05/2015	22/05/2015
Rimozione di serramenti esterni	1	E	1	1	25/05/2015	25/05/2015
Realizzazione di divisori interni	1	E	5	5	25/05/2015	29/05/2015
Montaggio di capriate in legno	1	E	9	12	01/06/2015	12/06/2015
Montaggio di arcarecci in legno	1	E	5	5	15/06/2015	19/06/2015
Realizzazione di copertura a tetto rovescio	1	E	5	5	22/06/2015	26/06/2015
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	5	5	29/06/2015	03/07/2015
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	2	2	06/07/2015	07/07/2015
Rimozione di massetto	1	E	4	4	08/06/2015	11/06/2015
Rimozione di pavimenti esterni	1	E	2	4	12/06/2015	15/06/2015
Taglio di muratura a tutto spessore	1	E	4	4	15/06/2015	18/06/2015
Scavo di sbancamento	1	E	5	5	22/06/2015	26/06/2015
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	5	5	29/06/2015	03/07/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	1	1	19/06/2015	19/06/2015
Realizzazione di impianto ascensore	1	E	5	5	22/06/2015	26/06/2015
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	1	E	5	5	06/07/2015	10/07/2015
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	5	5	13/07/2015	17/07/2015
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	1	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	8	10	22/07/2015	31/07/2015
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	1	E	2	2	03/08/2015	04/08/2015
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica	1	E	3	3	05/08/2015	07/08/2015

Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	3	3	10/08/2015	12/08/2015
Posa di pavimenti per interni	1	E	4	6	13/08/2015	18/08/2015
Posa di rivestimenti interni	1	E	5	5	17/08/2015	21/08/2015
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	3	3	24/08/2015	26/08/2015
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	4	6	27/08/2015	01/09/2015
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	10	12	24/08/2015	04/09/2015
Posa di rivestimenti esterni	1	E	5	5	21/09/2015	25/09/2015
Posa di rivestimenti esterni in marmo	1	E	3	3	07/09/2015	09/09/2015
Posa di serramenti esterni	1	E	5	5	05/10/2015	09/10/2015
Ripresa di intonaco pareti esterne	1	E	3	3	24/08/2015	26/08/2015
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	5	28/09/2015	02/10/2015
Formazione di massetto per esterni	1	E	3	3	12/10/2015	14/10/2015
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	2	2	15/10/2015	16/10/2015
Posa di pavimenti per esterni	1	E	5	5	19/10/2015	23/10/2015
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	3	3	26/10/2015	28/10/2015
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	29/10/2015	30/10/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	16 Mar 15 23 Mar 15 30 Mar 15 06 Apr 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra	1 g	Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z1
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g	Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche e ac	g	Z1
Rimozione di impianti	2 g	Z1
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	8 g	Z1
Rimozione di manto di copertura in tegole	2 g	
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g	
Demolizione di tetti a falde con orditura in legno	3 g	
Rimozione di serramenti interni	1 g	
Rimozione di pavimenti interni	2 g	
Rimozione di massetto	3 g	
Demolizione di pareti divisorie	5 g	
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2 g	
Demolizione di solai in legno	3 g	
Demolizione di solai in c.a.	3 g	
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g	
Rimozione di serramenti esterni	1 g	
Realizzazione di divisori interni	5 g	
Montaggio di capriate in legno	9 g	
Montaggio di arcarecci in legno	5 g	
Realizzazione di copertura a tetto rovescio	5 g	
Posa di manto di copertura in tegole	5 g	
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g	
Rimozione di massetto	4 g	
Rimozione di pavimenti esterni	2 g	
Taglio di muratura a tutto spessore	4 g	
Scavo di sbancamento	5 g	
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g	
Realizzazione di impianto di messa a terra	1 g	
Realizzazione di impianto ascensore	5 g	
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	5 g	

Nome attività	Durata	16 Mar 15							23 Mar 15							30 Mar 15							06 Apr 15		
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09				
Realizzazione di impianto elettrico interno	5 g																								
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	2 g																								
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	8 g																								
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	2 g																								
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica	3 g																								
Formazione intonaci interni (tradizionali)	3 g																								
Posa di pavimenti per interni	4 g																								
Posa di rivestimenti interni	5 g																								
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	3 g																								
Tinteggiatura di superfici interne	4 g																								
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	10 g																								
Posa di rivestimenti esterni	5 g																								
Posa di rivestimenti esterni in marmo	3 g																								
Posa di serramenti esterni	5 g																								
Ripresa di intonaco pareti esterne	3 g																								
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g																								
Formazione di massetto per esterni	3 g																								
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	2 g																								
Posa di pavimenti per esterni	5 g																								
Posa di recinzioni e cancellate	3 g																								
Smobilizzo del cantiere	2 g																								
LEGENDA Zona:																									
Z1 = ZONA UNICA																									

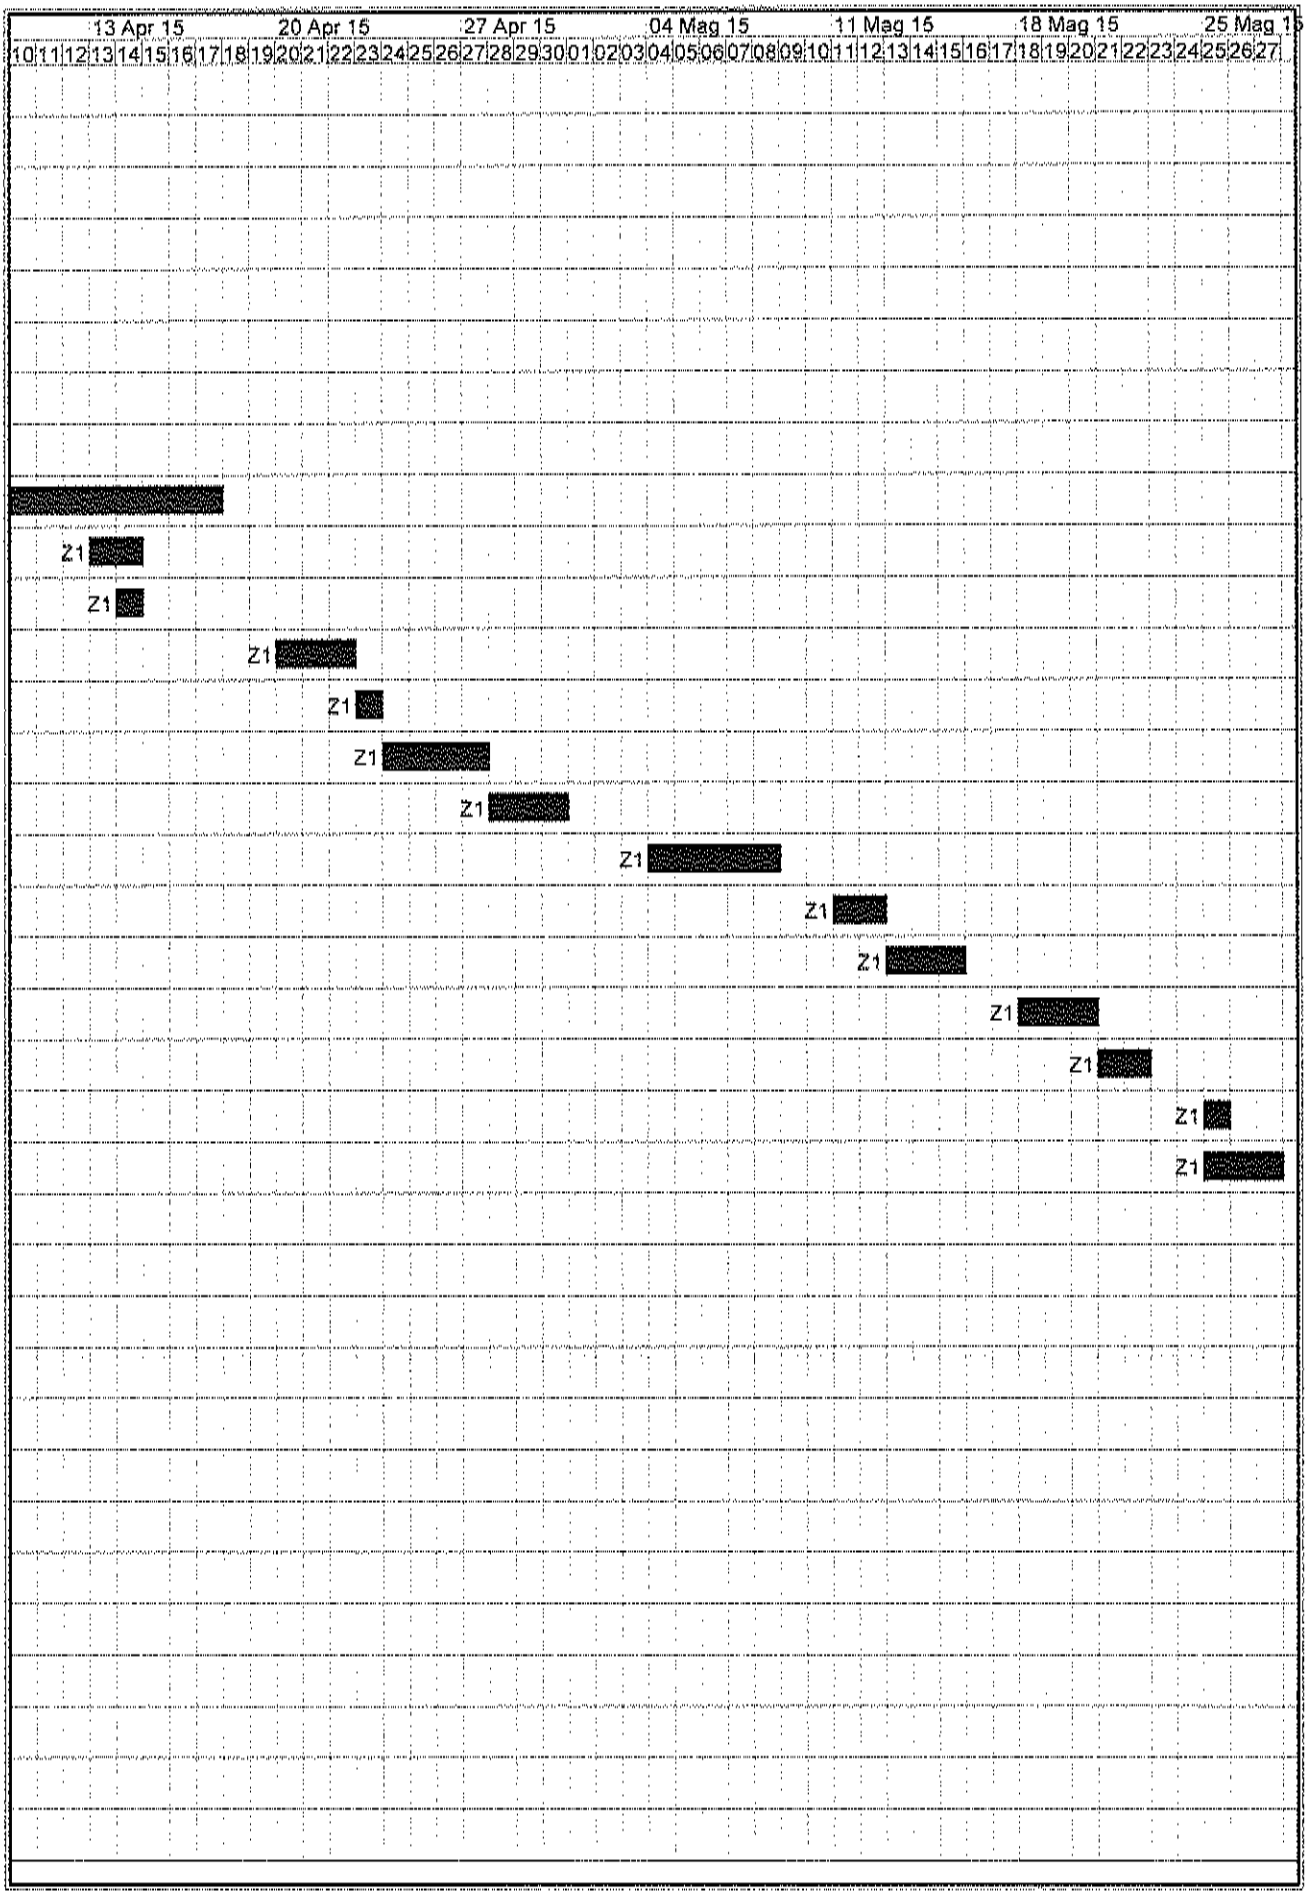
13 Apr 15
20 Apr 15
27 Apr 15
04 Mag 15
11 Mag 15
18 Mag 15
25 Mag 15
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

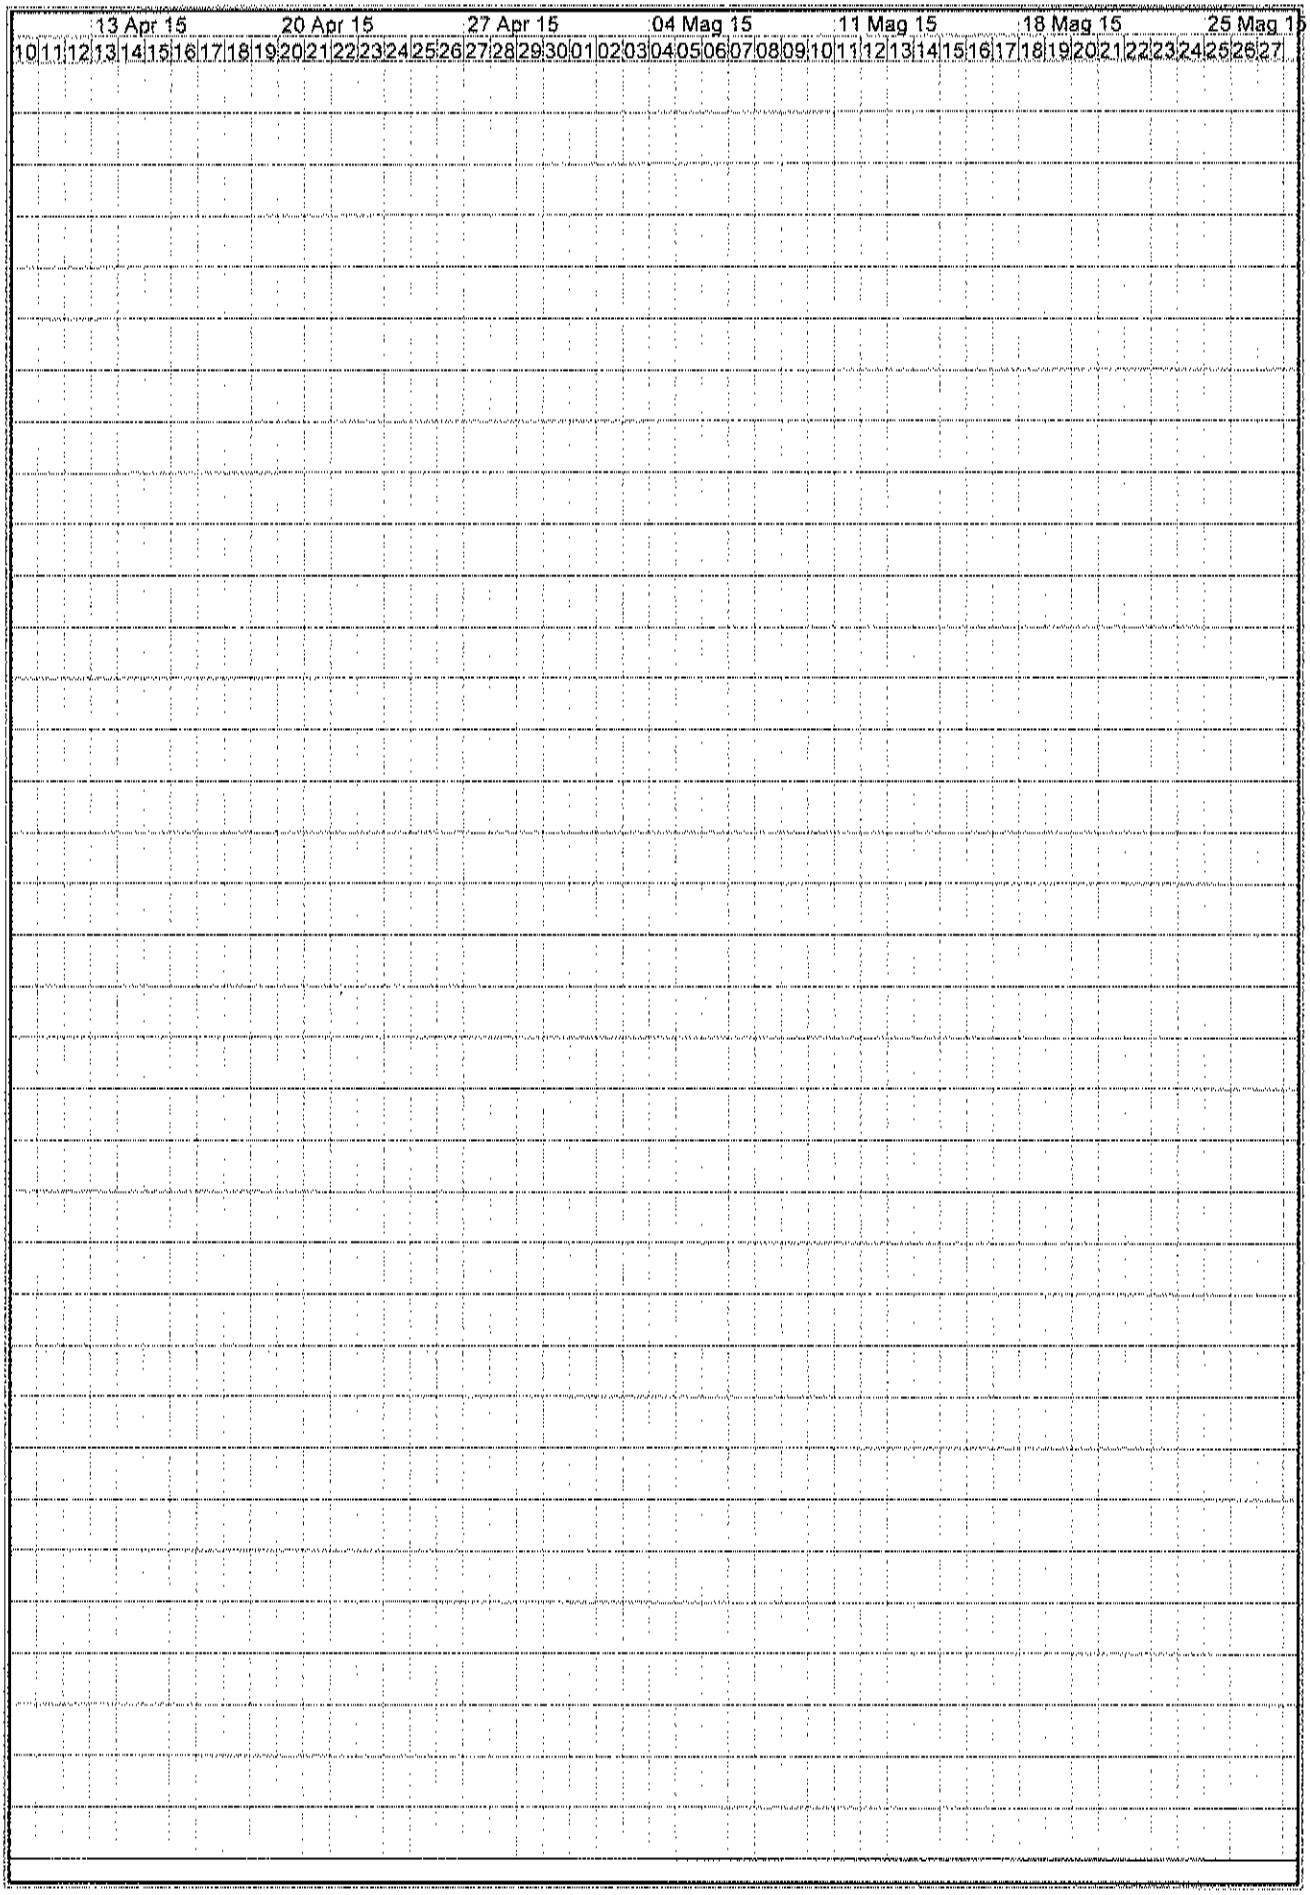
13 Apr 15
20 Apr 15
27 Apr 15
04 Mag 15
11 Mag 15
18 Mag 15
25 Mag 15
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

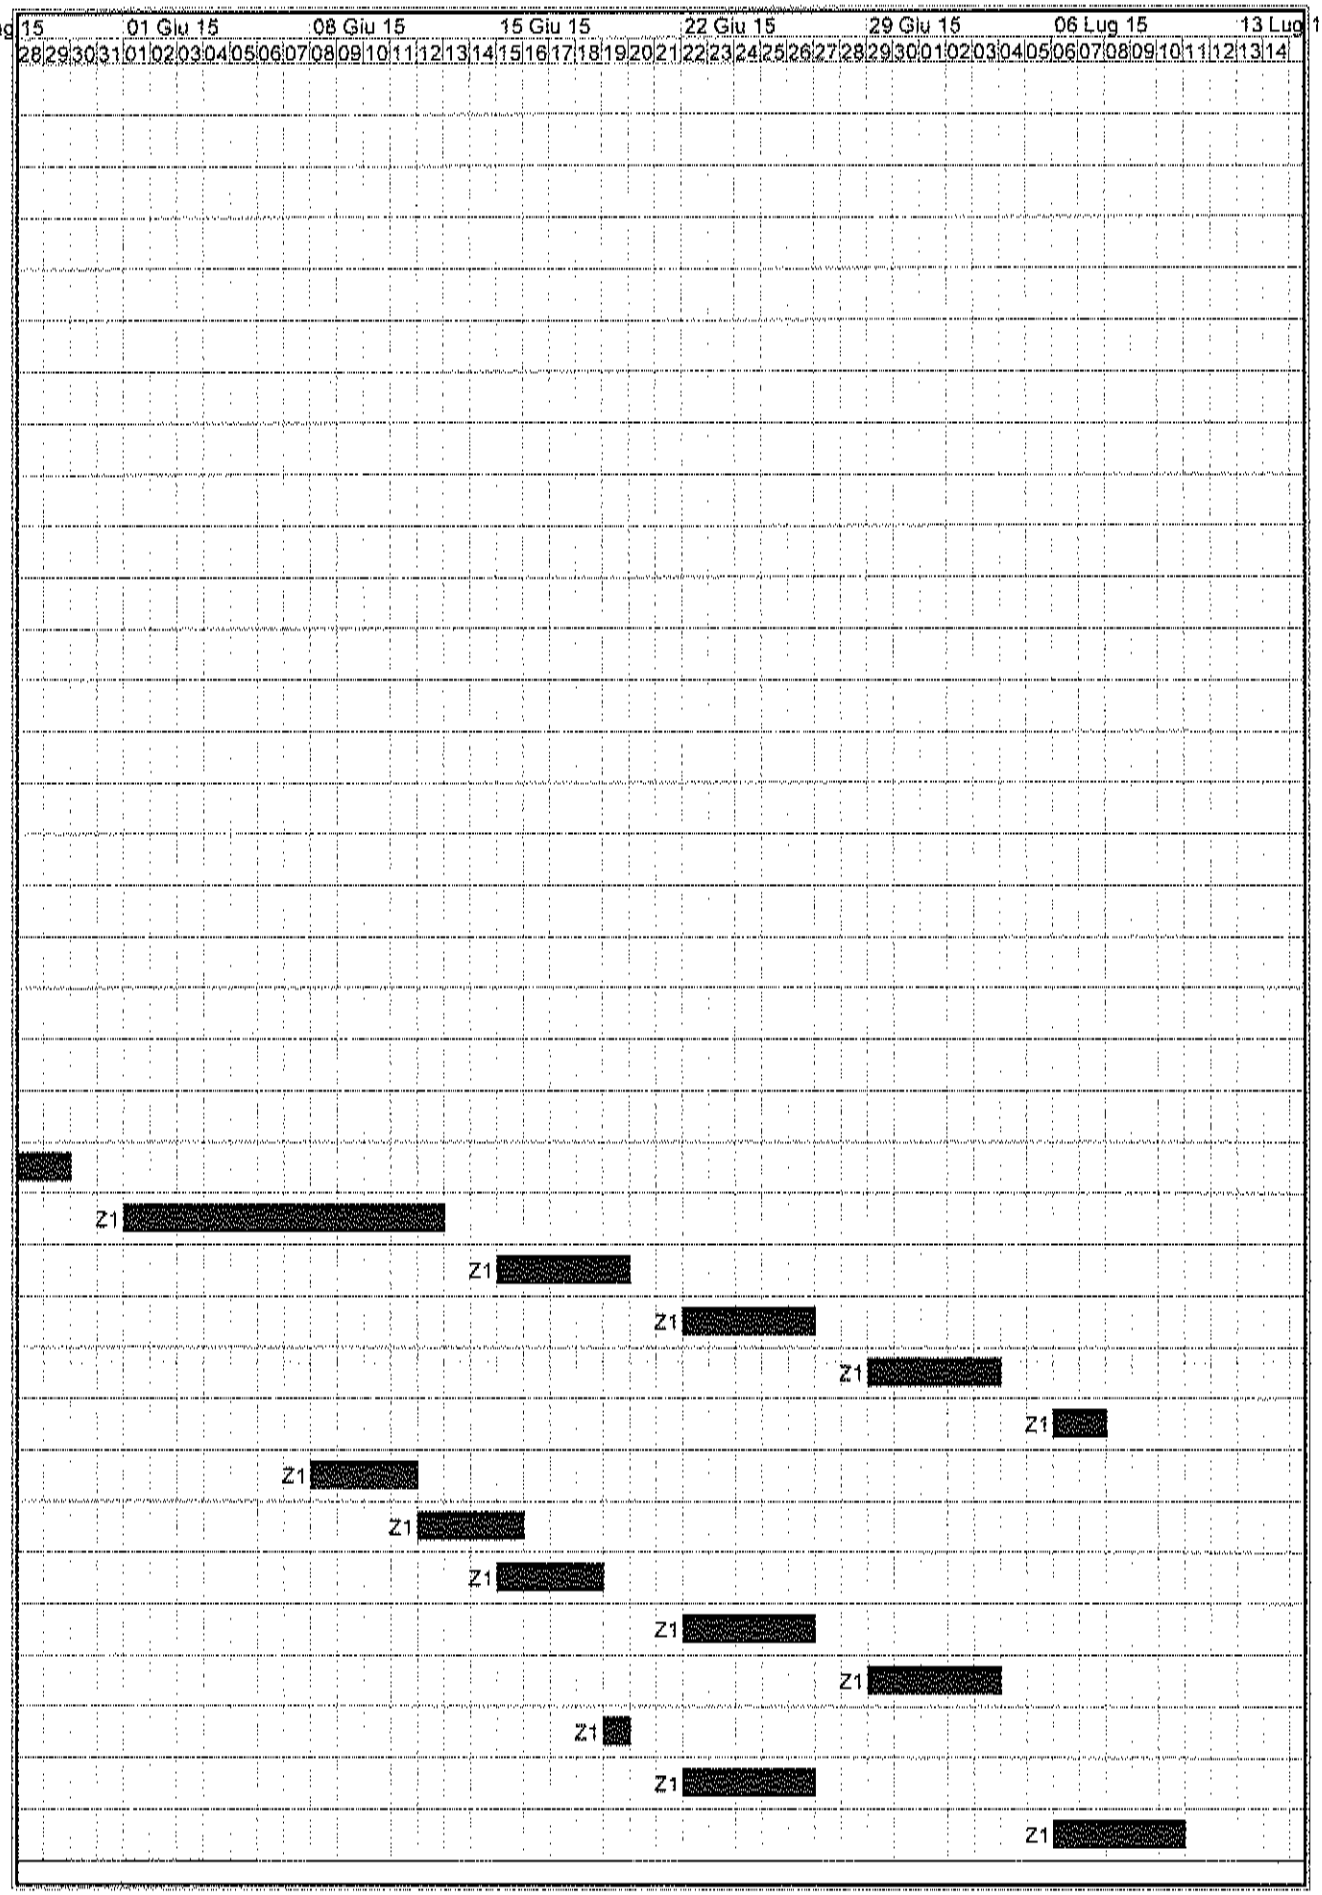
25 Mag 15
01 Giu 15
08 Giu 15
15 Giu 15
22 Giu 15
29 Giu 15
06 Lug 15
13 Lug 15
28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

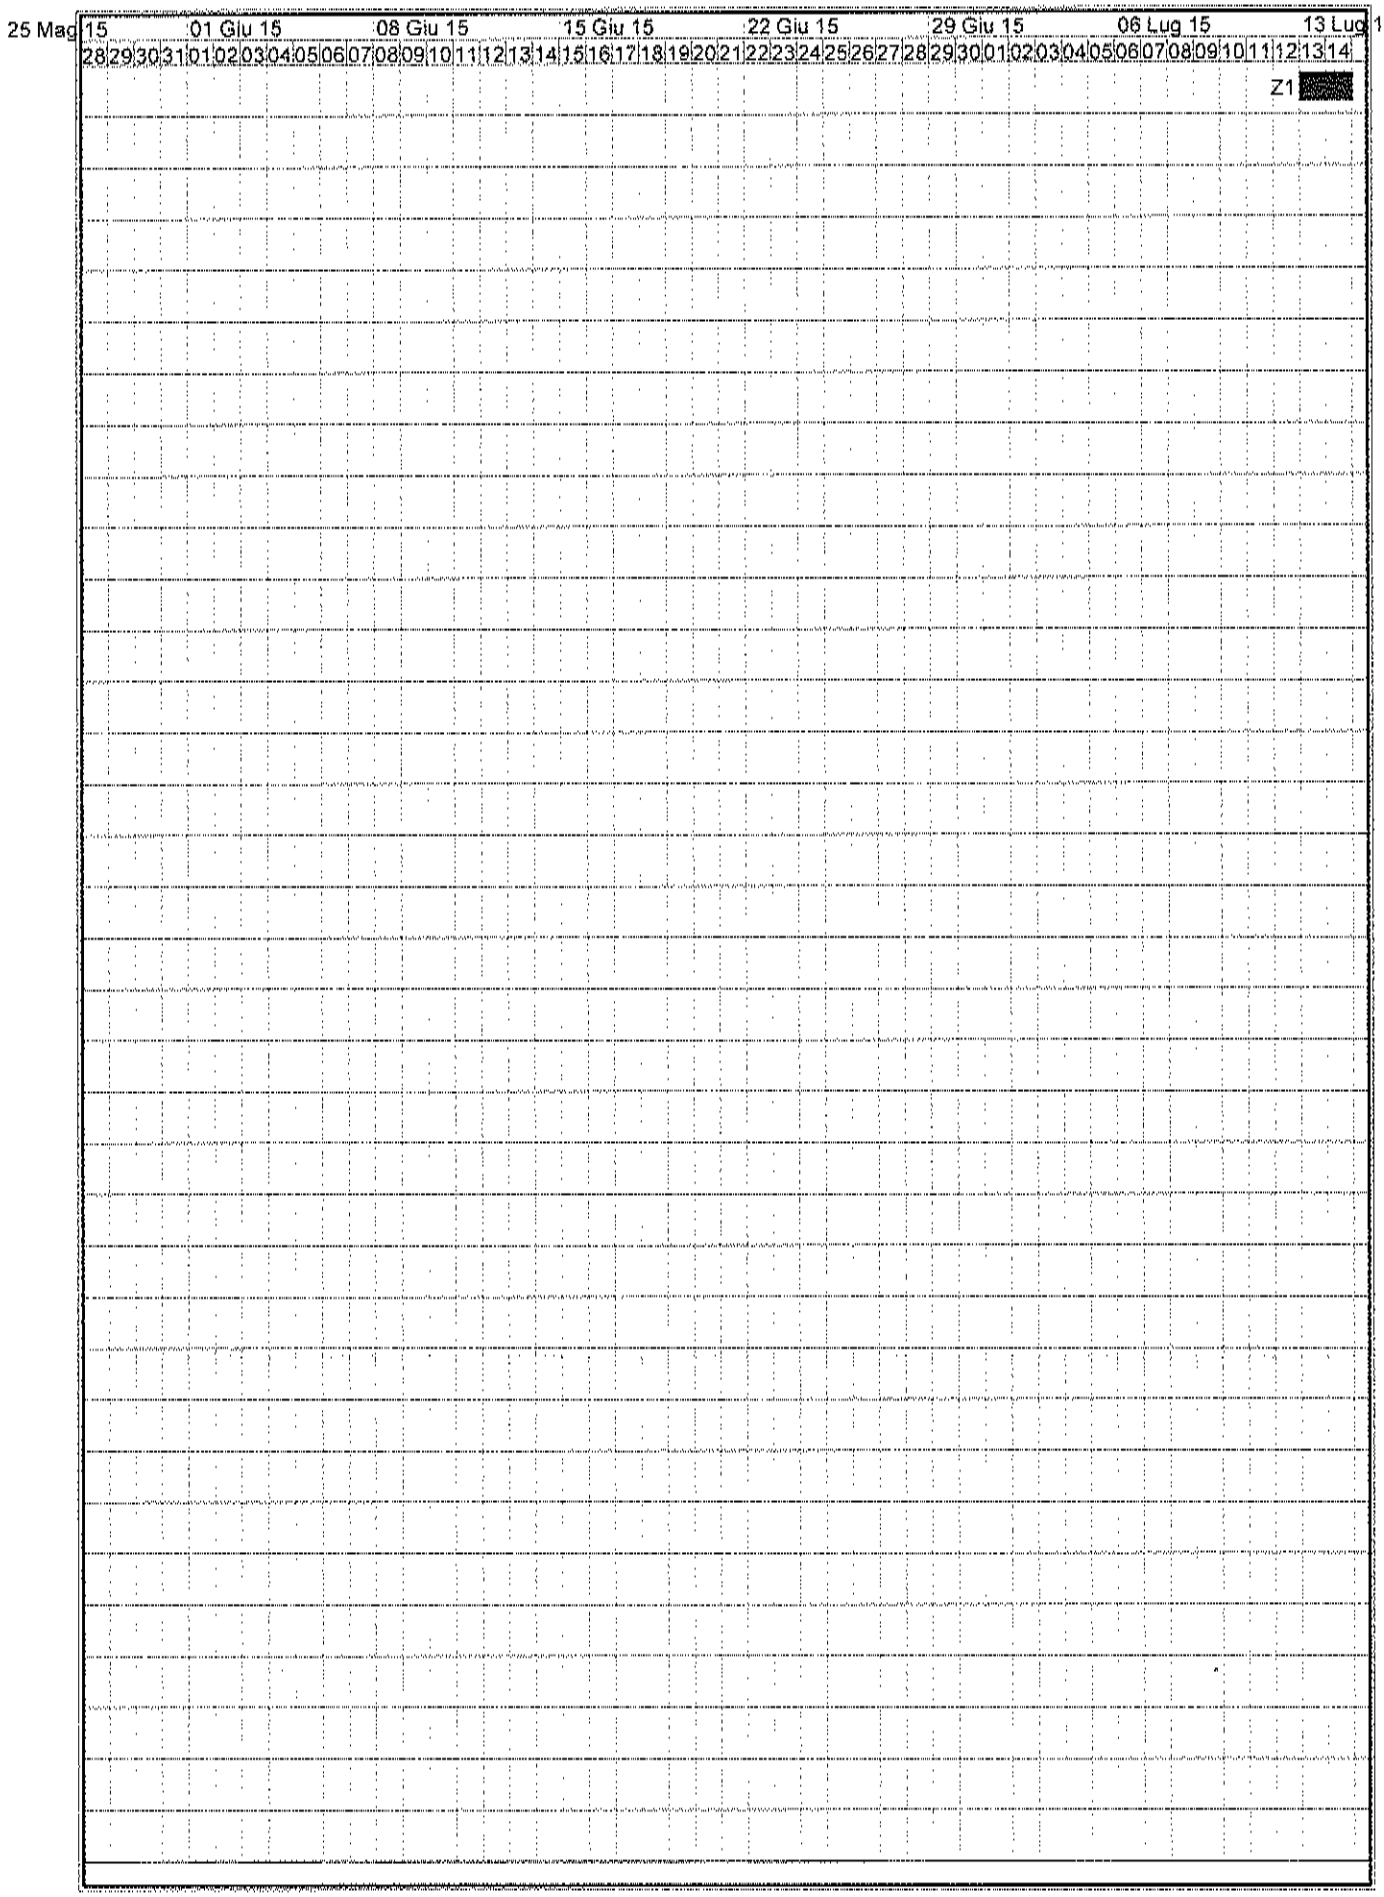
25 Mag 15
01 Giu 15
08 Giu 15
15 Giu 15
22 Giu 15
29 Giu 15
06 Lug 15
13 Lug 15
28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Z1

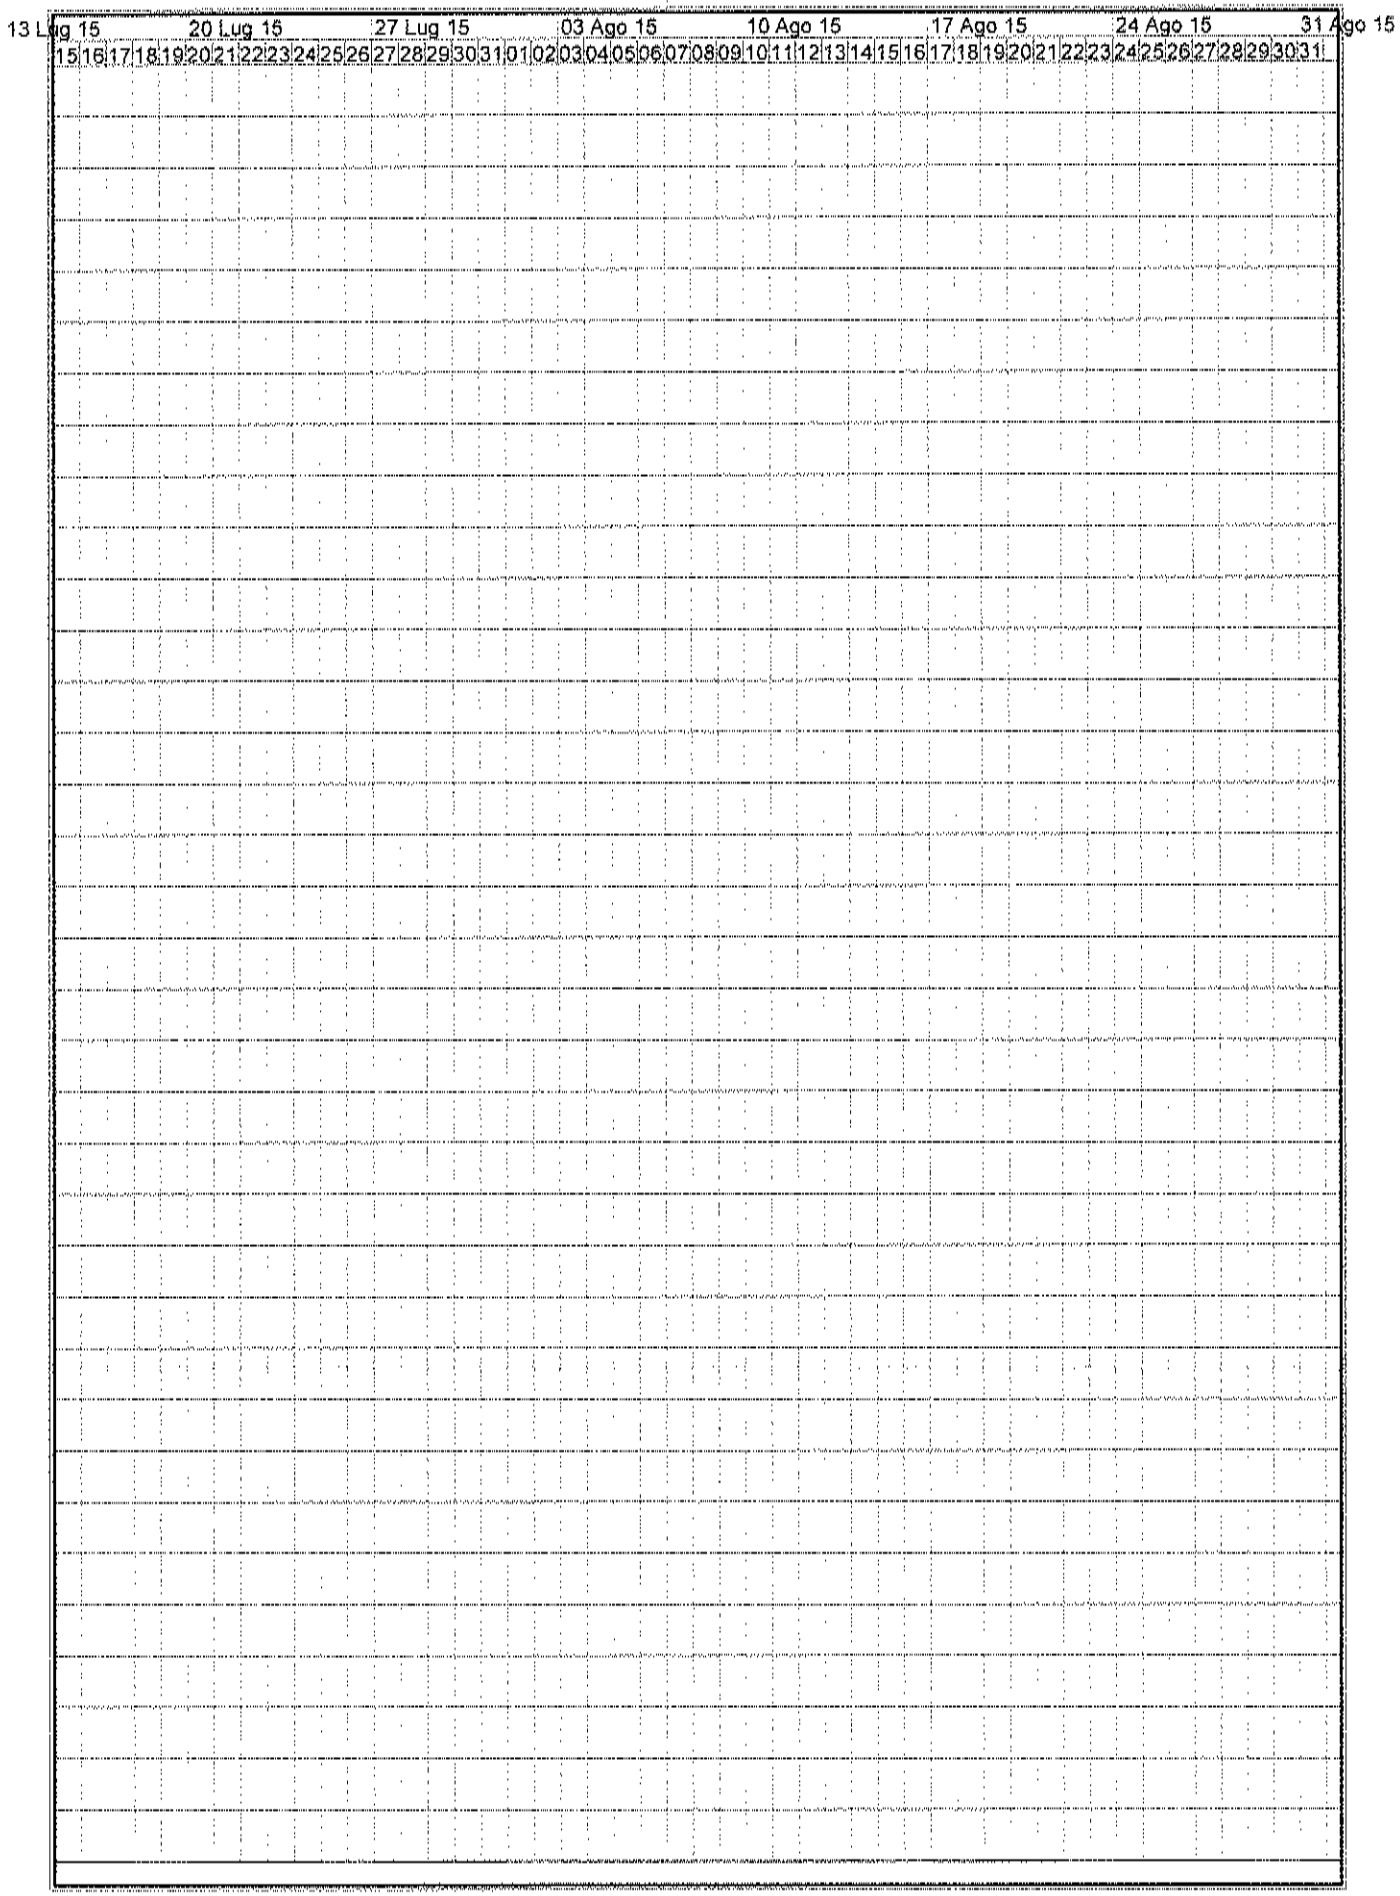
13 Lug 15
20 Lug 15
27 Lug 15
03 Ago 15
10 Ago 15
17 Ago 15
24 Ago 15
31 Ago 15
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

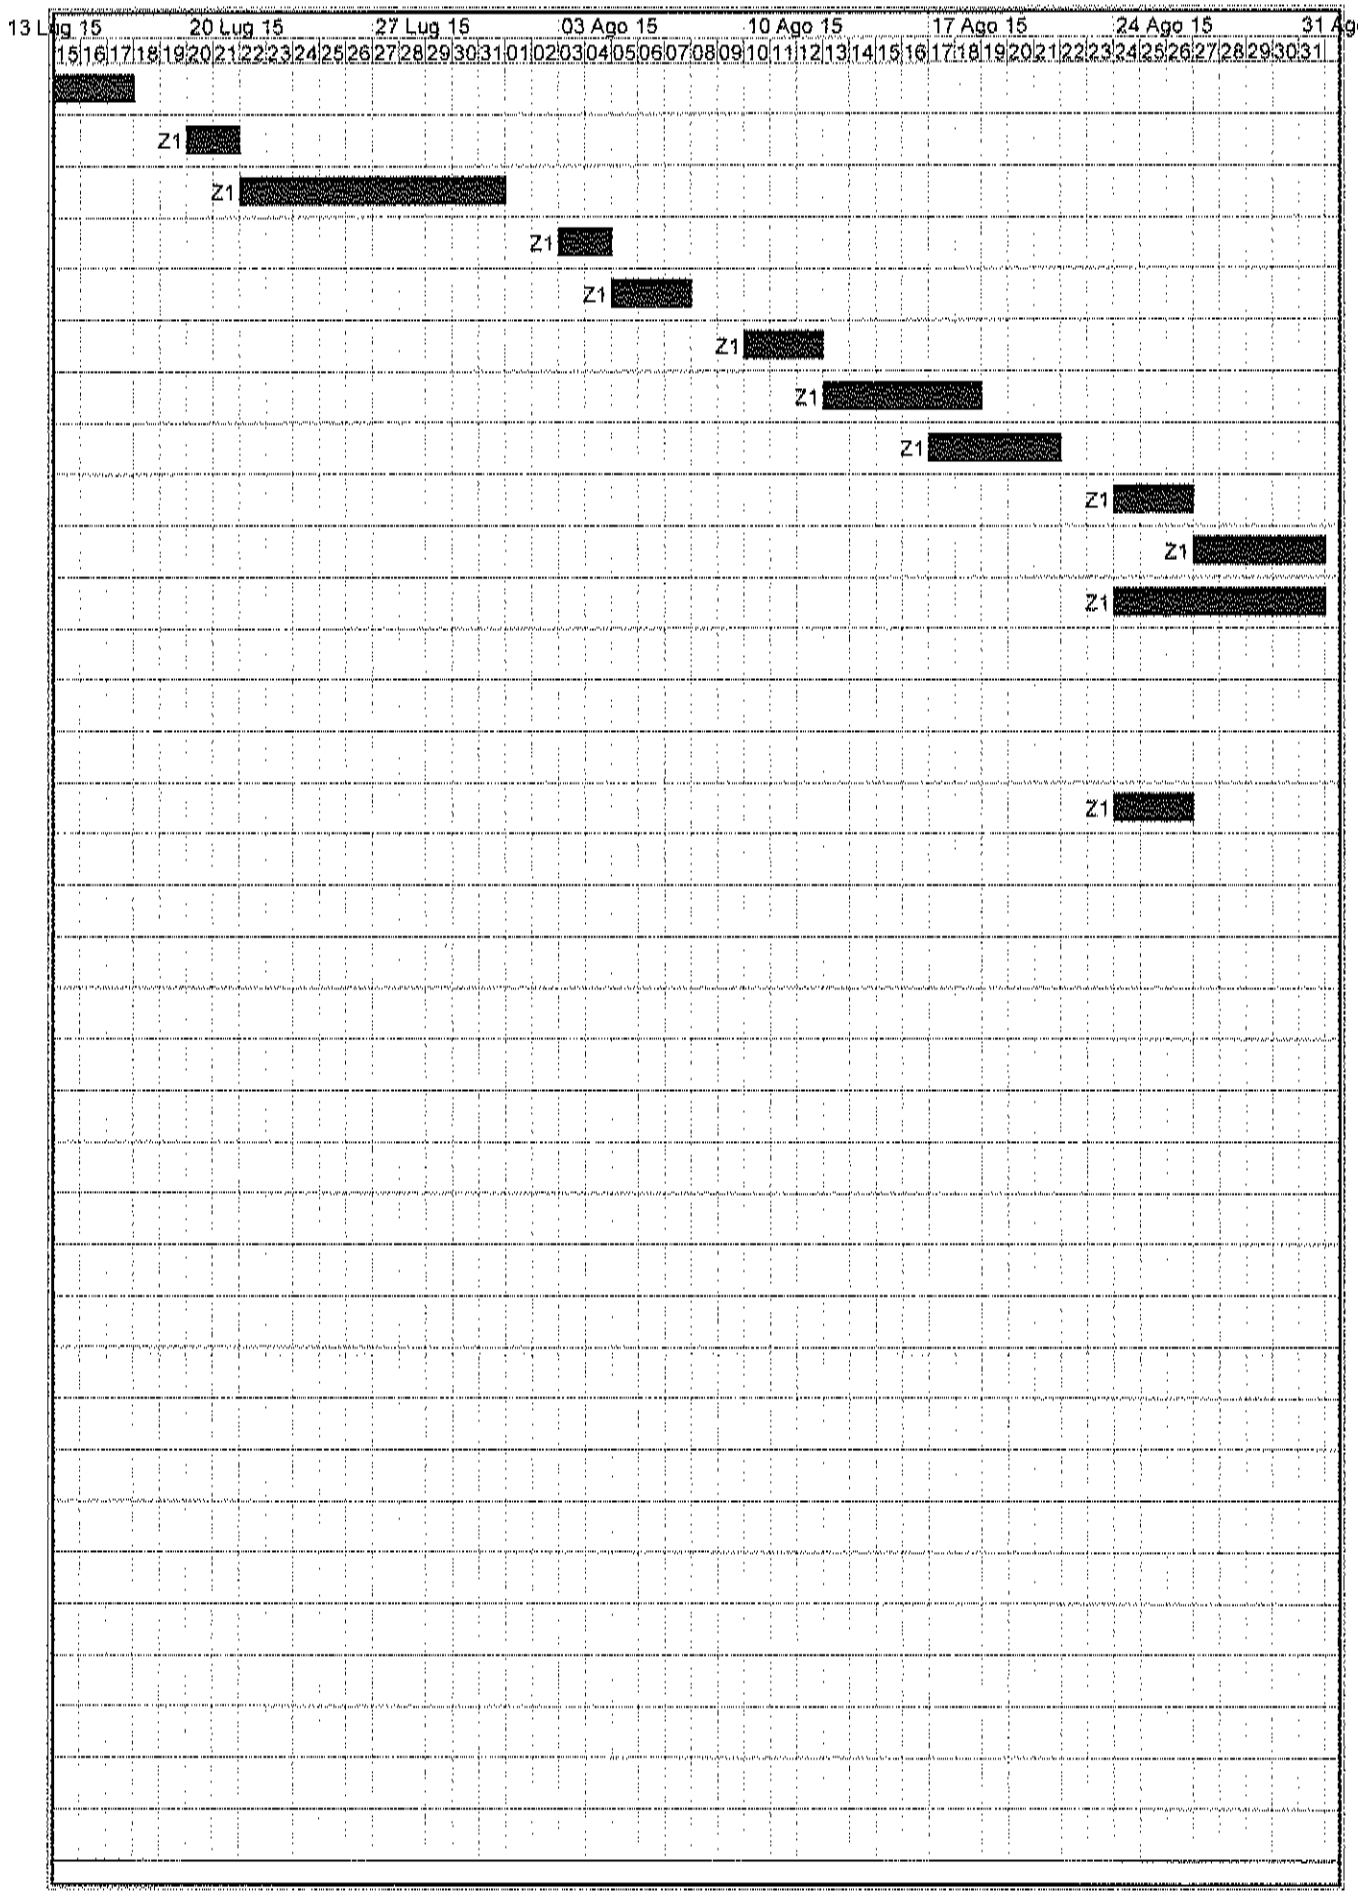
13 Lug 15
20 Lug 15
27 Lug 15
03 Ago 15
10 Ago 15
17 Ago 15
24 Ago 15
31 Ago 15
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

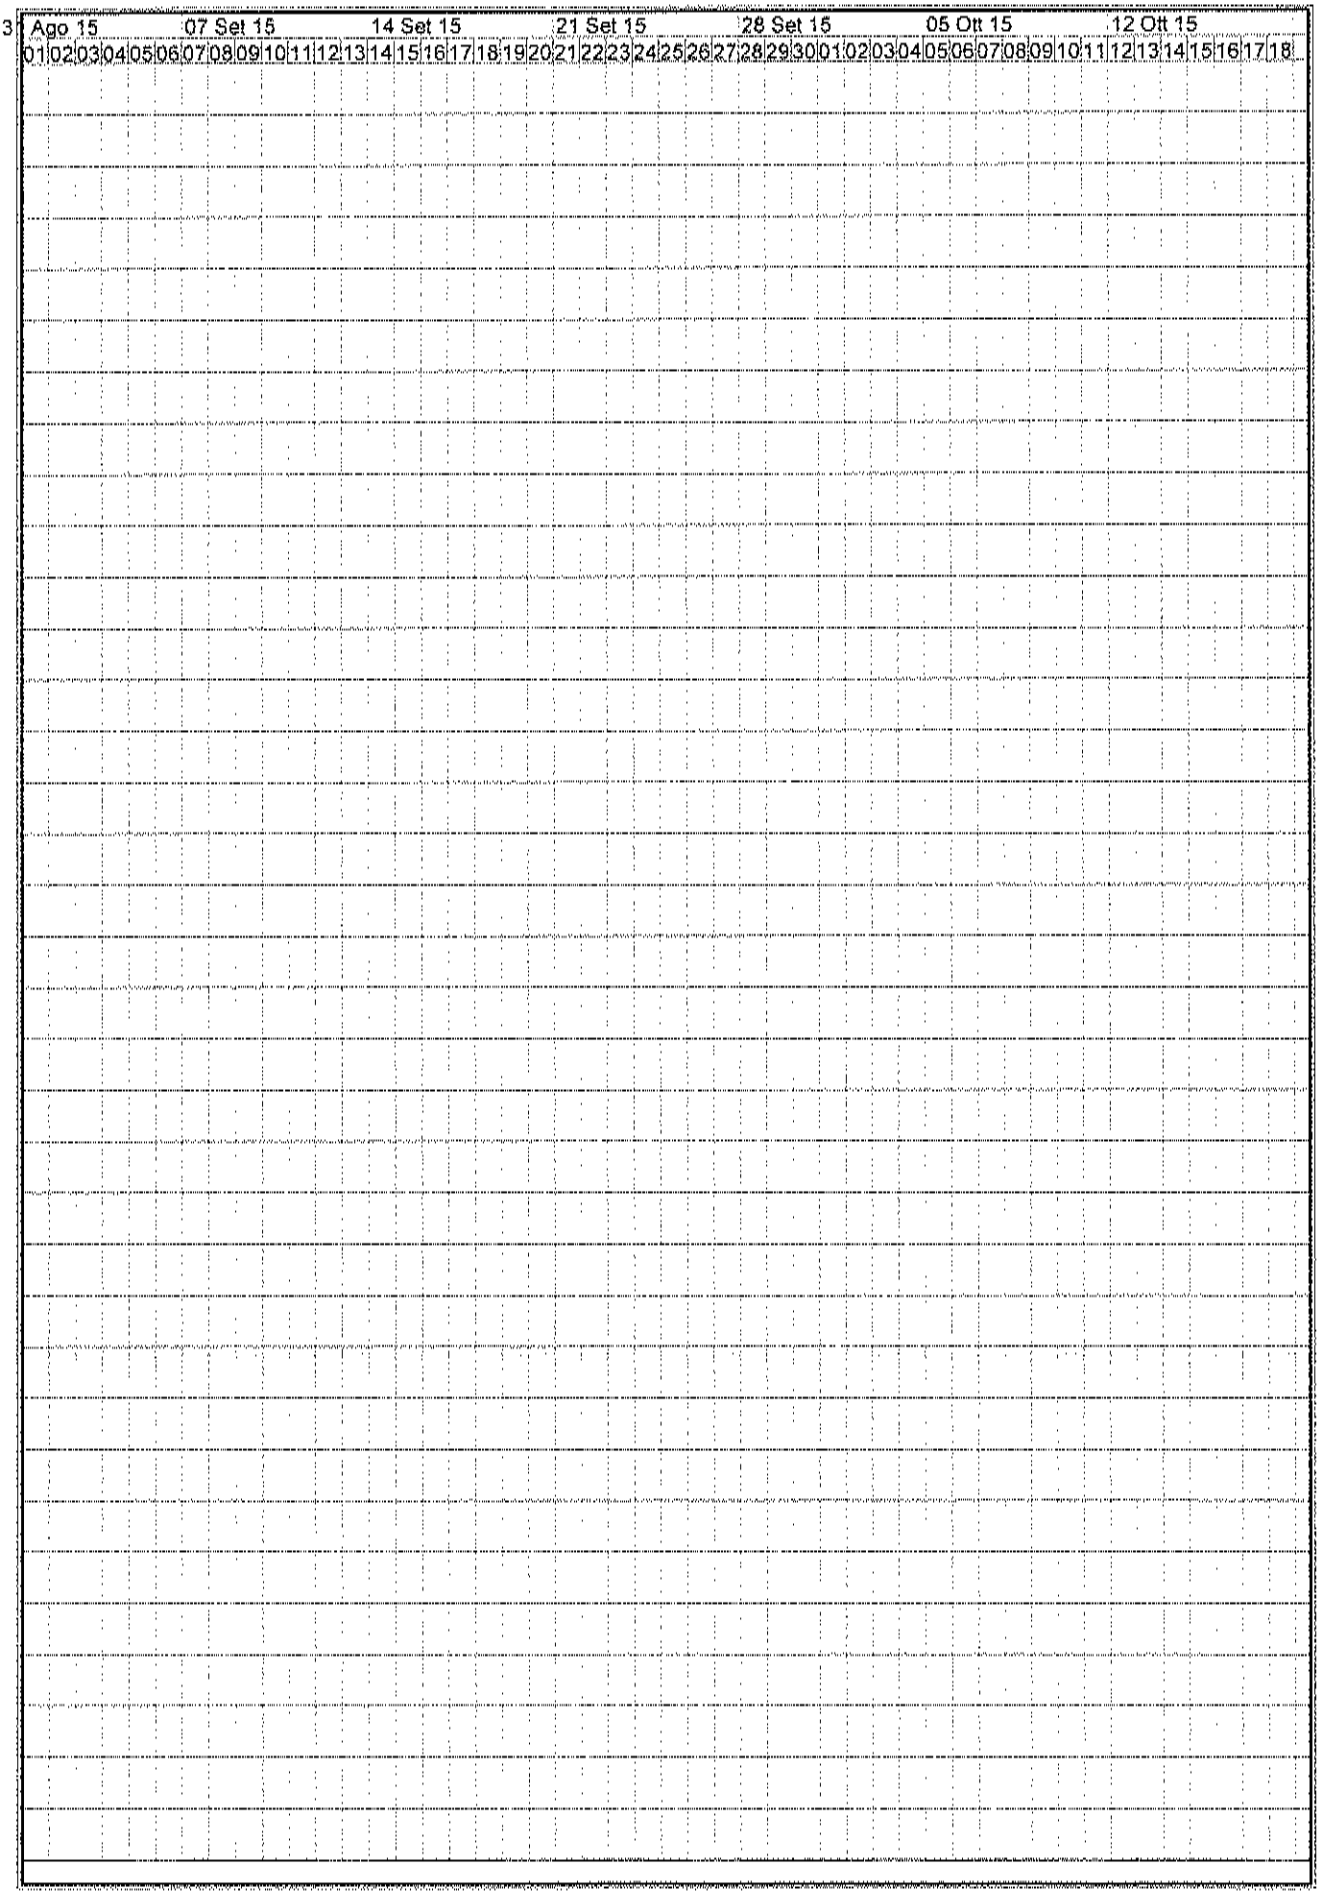
3
Ago 15
07 Set 15
14 Set 15
21 Set 15
28 Set 15
05 Ott 15
12 Ott 15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

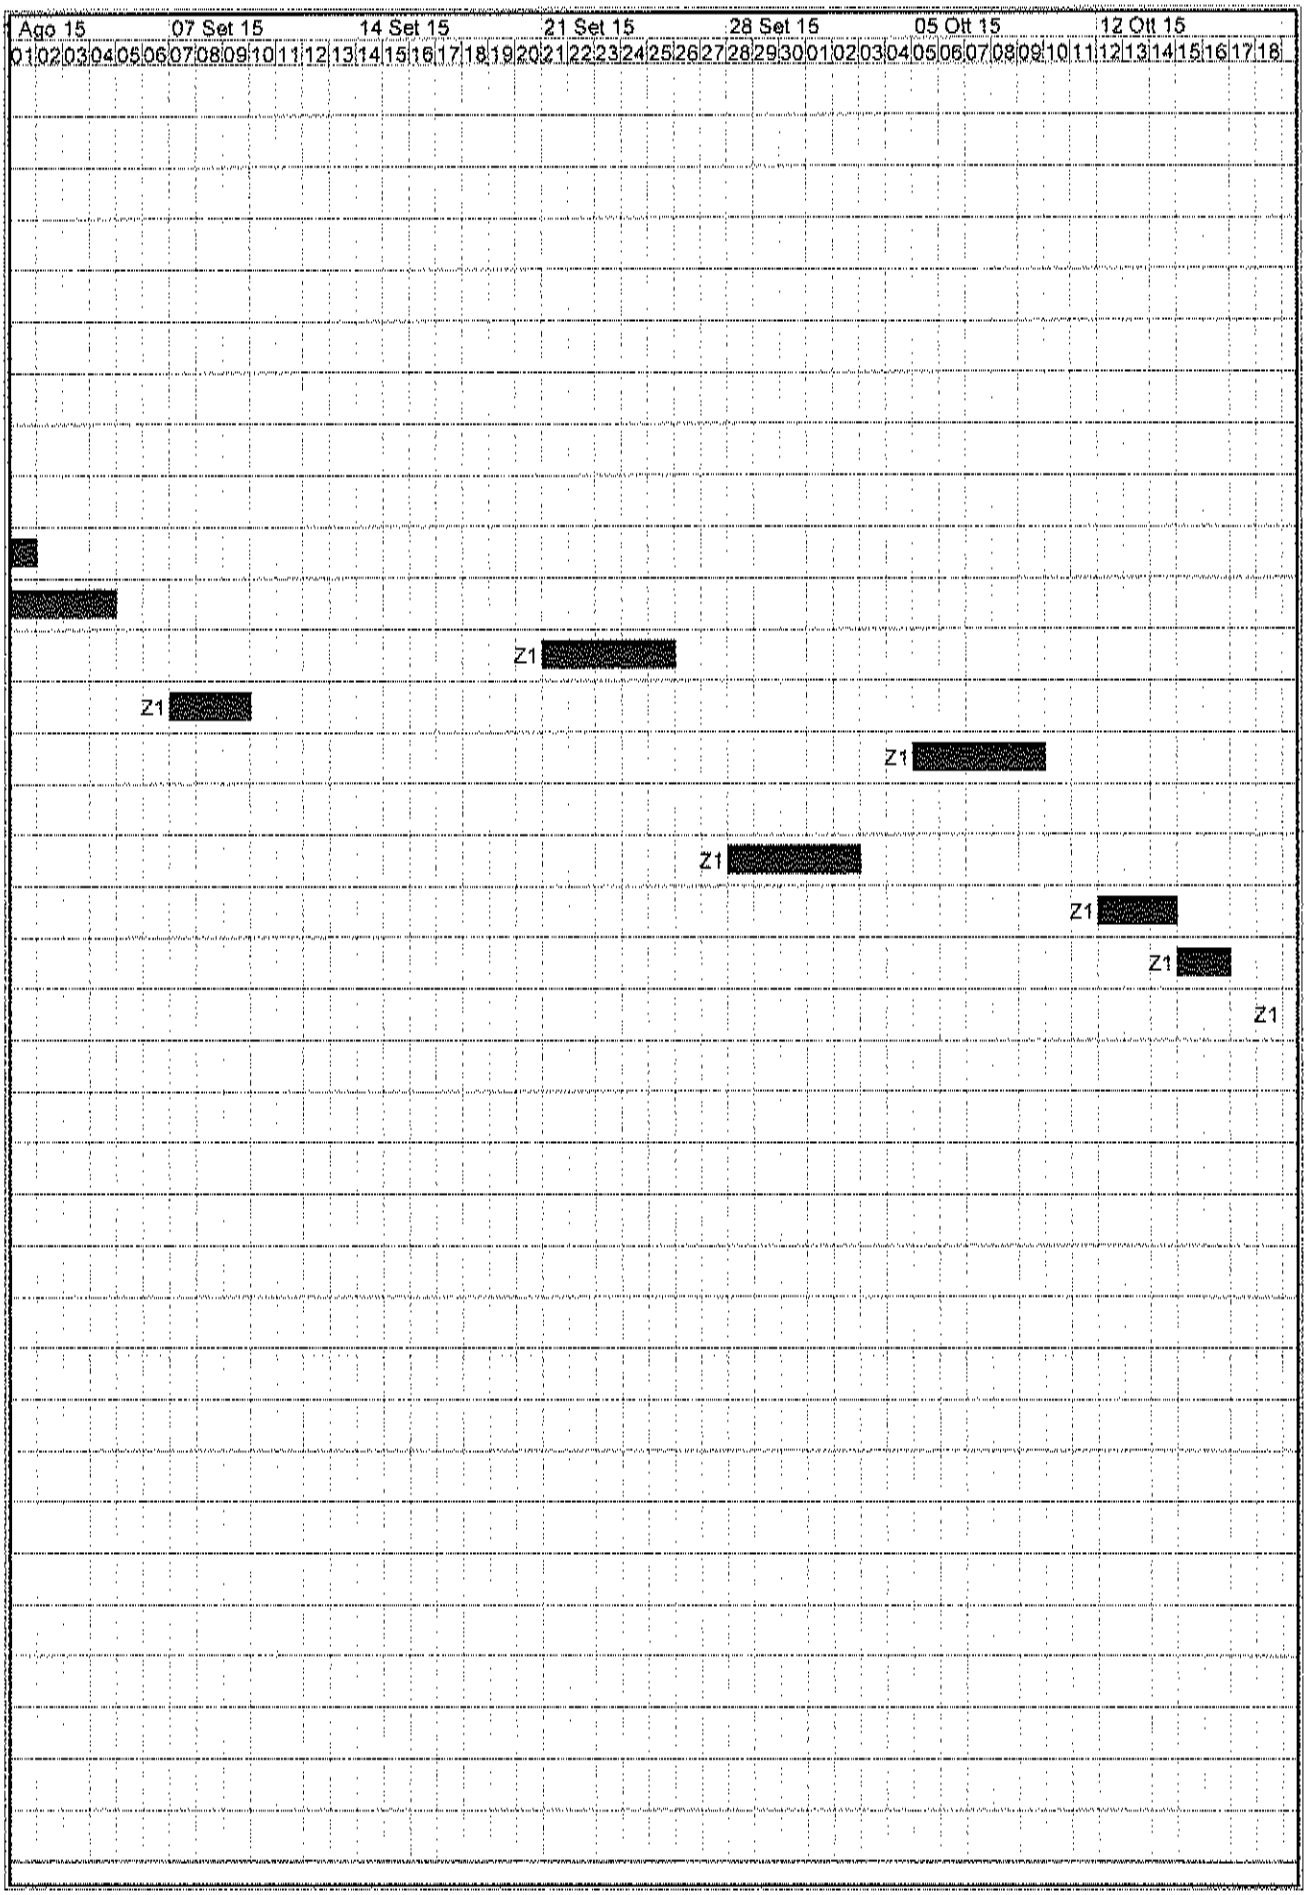
Ago 15
07 Set 15
14 Set 15
21 Set 15
28 Set 15
05 Ott 15
12 Ott 15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

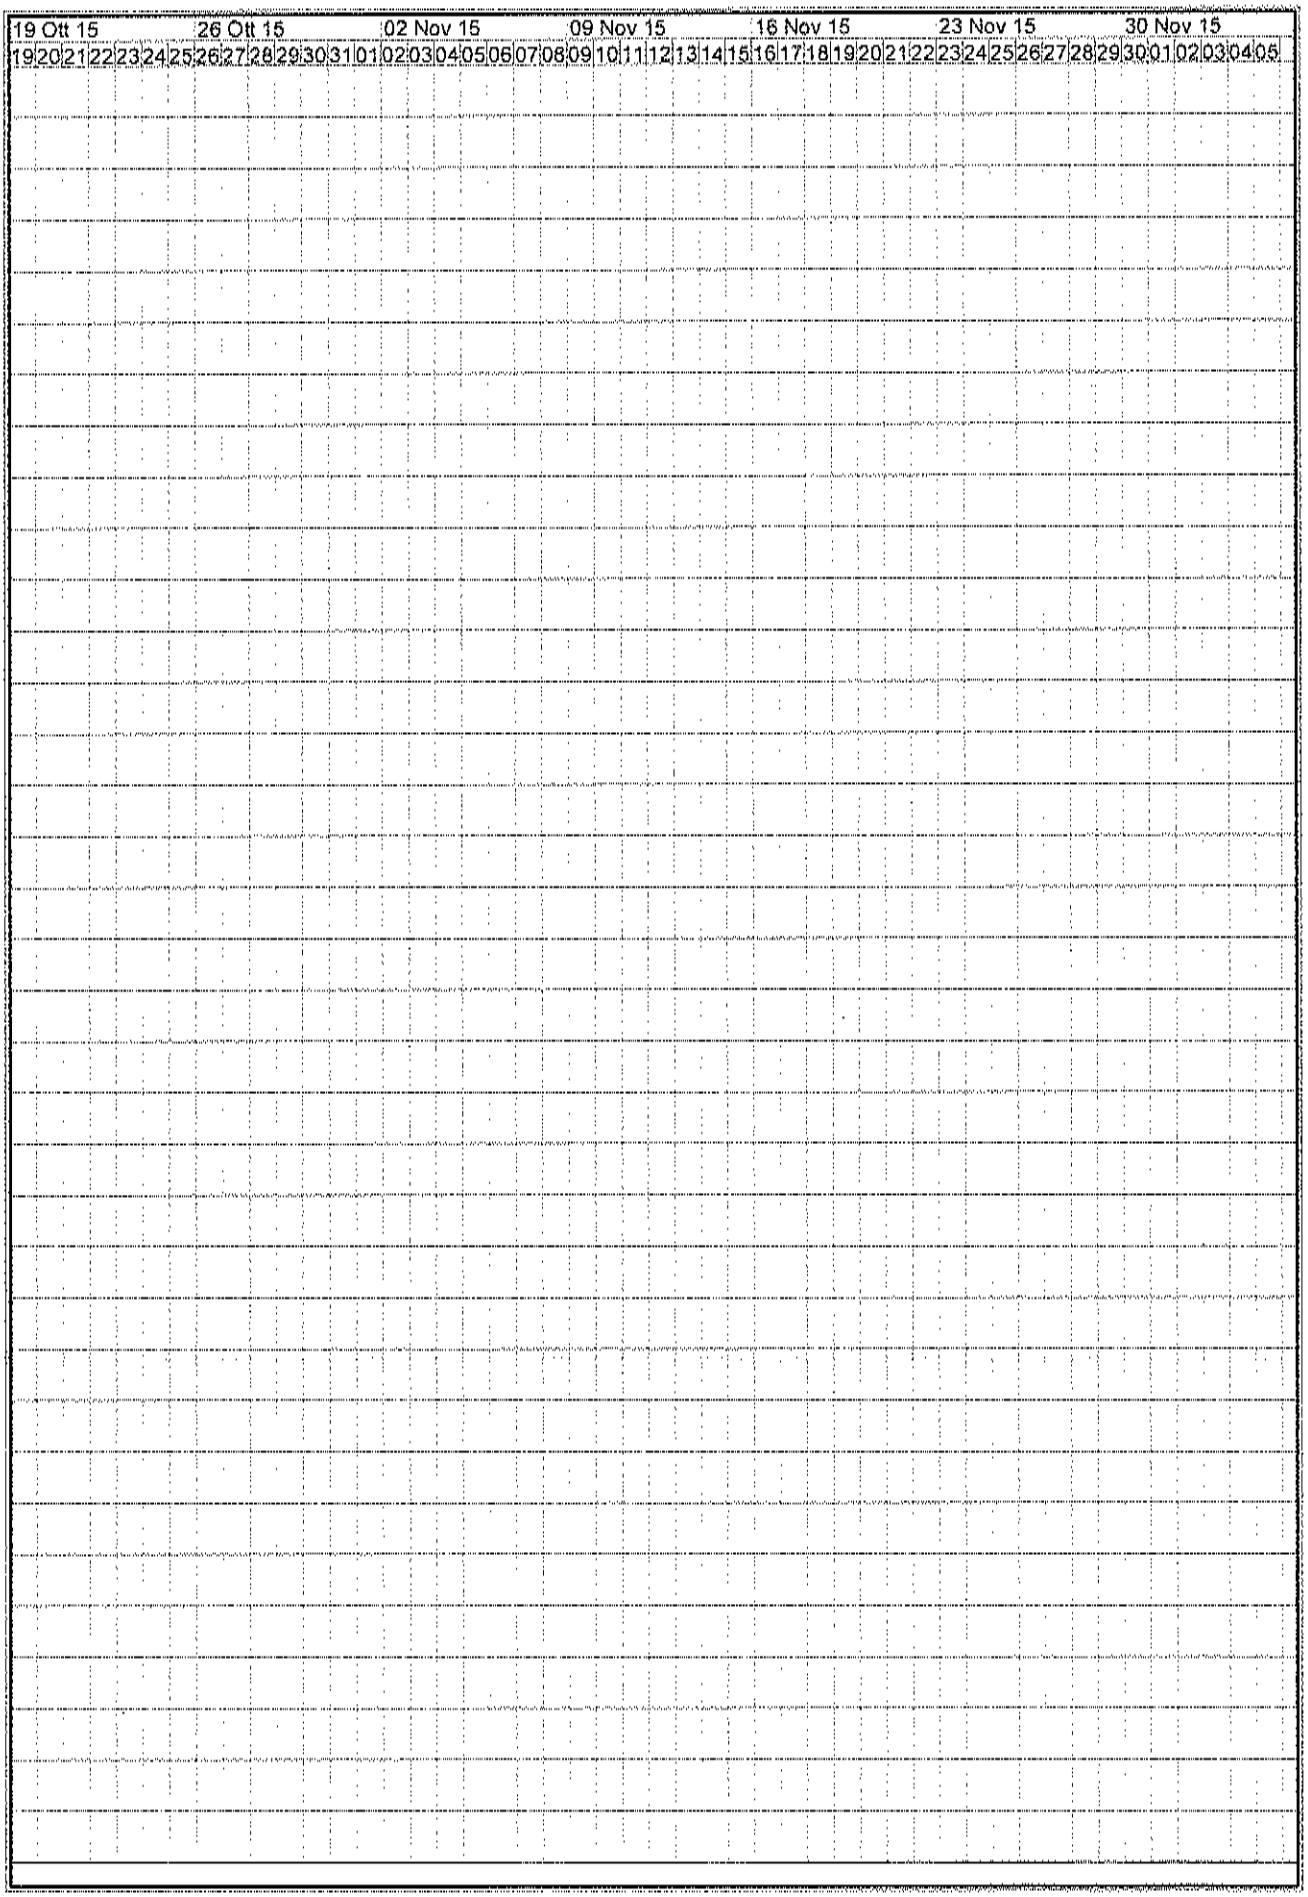
19 Ott 15
26 Ott 15
02 Nov 15
09 Nov 15
16 Nov 15
23 Nov 15
30 Nov 15
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05

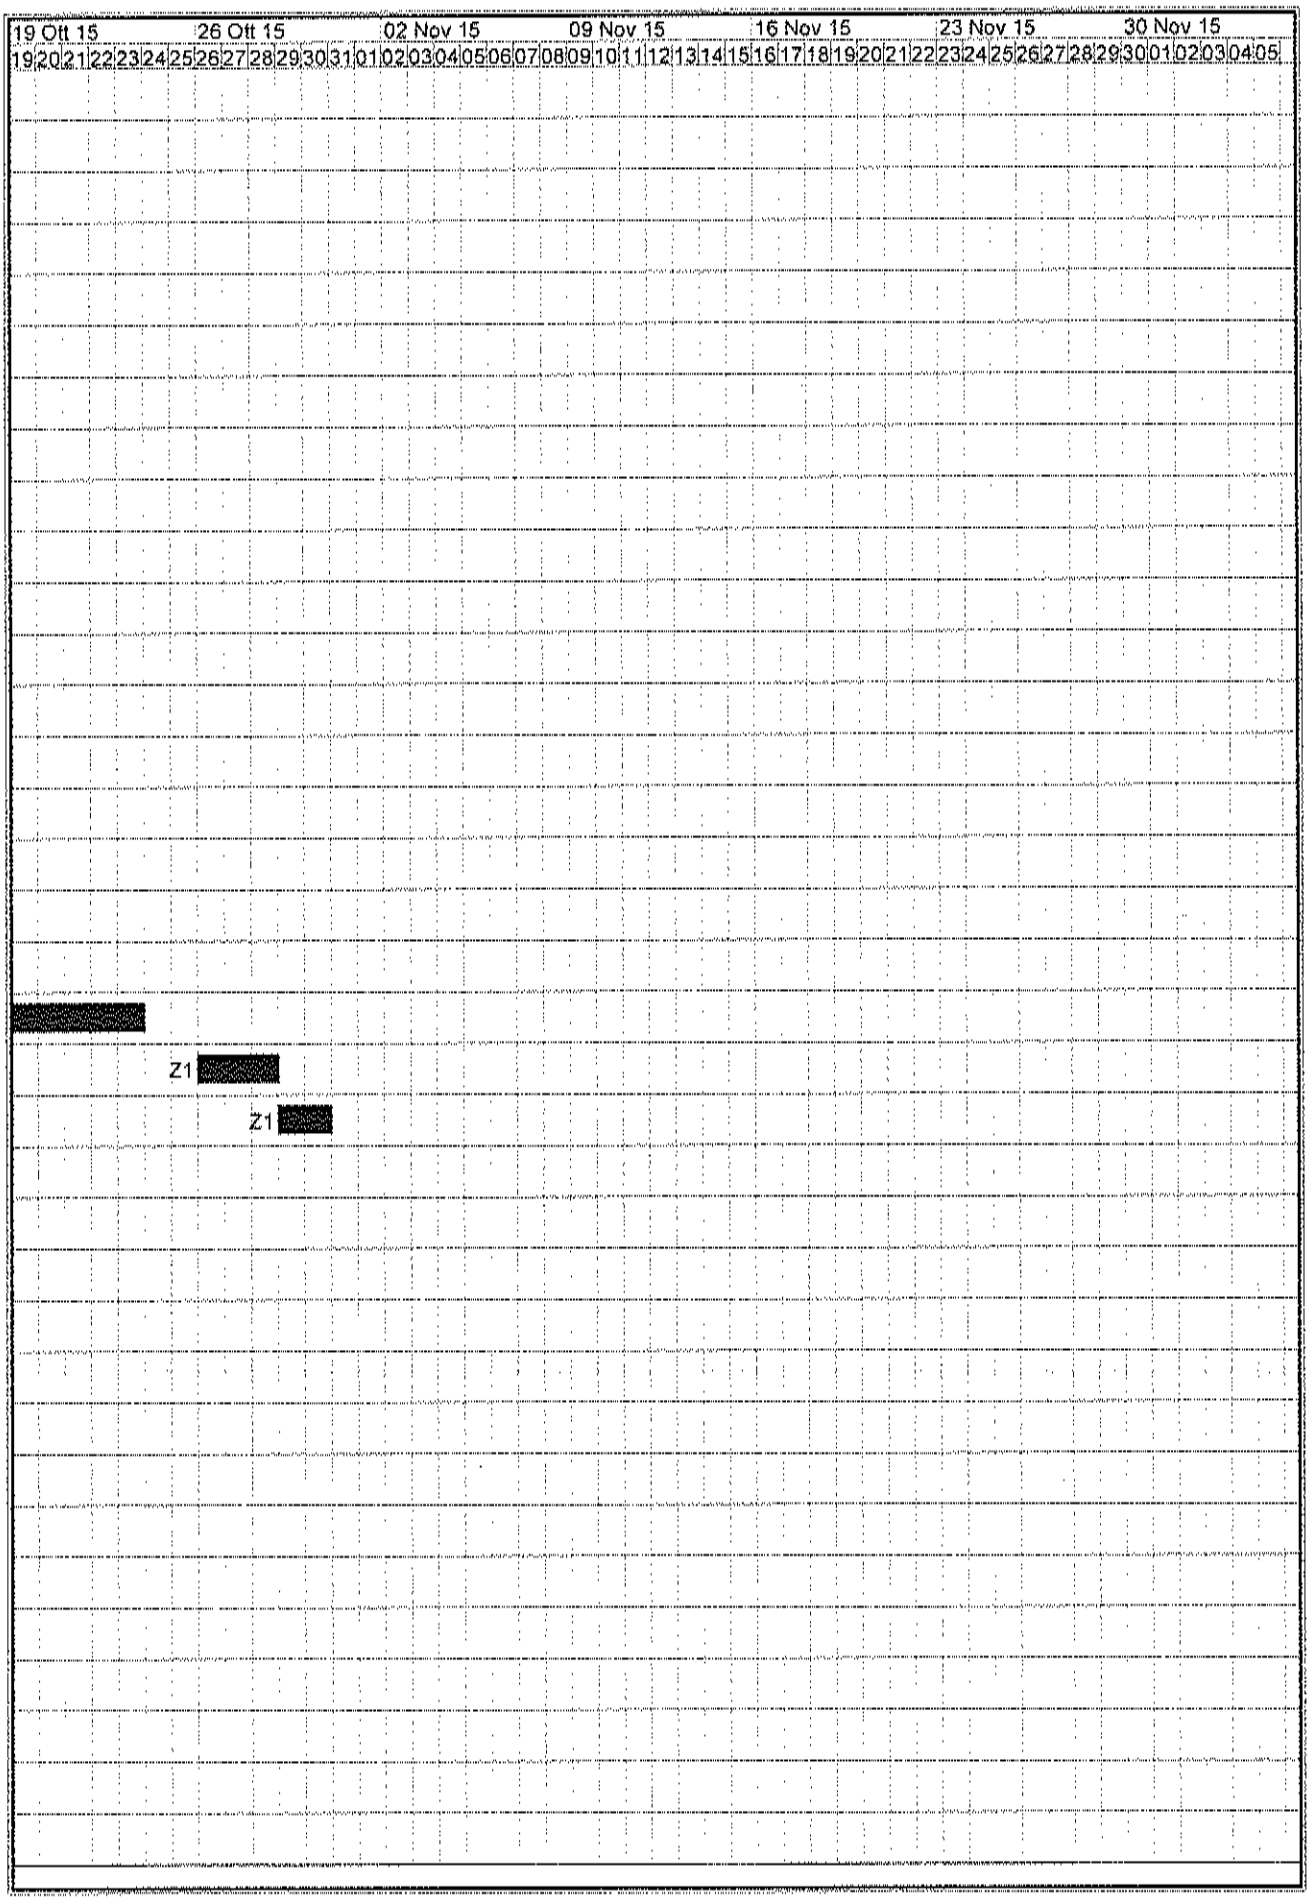
19 Ott 15
26 Ott 15
02 Nov 15
09 Nov 15
16 Nov 15
23 Nov 15
30 Nov 15
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05
[redacted]
Z1 [redacted]
Z1 [redacted]
